



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org

20378

SORCA-BMB


**ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL**

**CHOIX DE TECHNOLOGIES APPROPRIEES
POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES**

Projet No. DP/MLI/85/011

Rapport Final





**ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL**

**CHOIX DE TECHNOLOGIES APPROPRIEES
POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES**

Projet No. DP/MLI/85/011

Rapport Final

Mars 1993

**ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL**

**CHOIX DE TECHNOLOGIES APPROPRIEES
POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES**

Projet No. DP/MLI/85/011

Rapport Final

TABLE DES MATIERES

	<u>Page</u>
1. HISTORIQUE	1
2. SYNTHESE	4
3. LES PROBLEMES D'APPUI AU DEVELOPPEMENT	5
4. DEROULEMENT DU PROJET	6
5. RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET	11
5.1 Objectifs	11
5.2 Résultats attendus cumulés	11
5.3 Résultats obtenus	12
5.4 Dossiers étudiés, analysés et suivis	12
5.5 Conclusions	14
5.6 Formation	14
5.7 Banque de données	15
5.8 Appui logistique	16
6. COOPERATION AVEC LES PROJETS FED ET BIT	17
6.1 Projet FED	17
6.2 Projet PNUD/BIT	18
7. CONSTATATIONS ET LECONS A TIRER	18

**ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL**

**CHOIX DE TECHNOLOGIES APPROPRIÉES
POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES**

Projet No. DP/MLI/85/011

Rapport Final

TABLE DES MATIERES (suite)

	<u>Page</u>
8. FUTUR DU PROJET	19
Annexe 1 - Nombre cumulé d'interventions	
Annexe 2 - Importance relative du projet ONUDI dans le projet FED	
Annexe 3 - Comparaison des résultats attendus et réalisés	
Annexe 4 - Liste des projets ayant bénéficié d'une assistance technologique par antenne	
4.1 - Antenne de Bamako	
4.2 - Antenne de Ségou	
4.3 - Antenne de Sikasso	
4.4 - Antenne de Mopti	
4.5 - Antenne de Kayes	
4.6 - Antenne de Tombouctou	
Annexe 5 - Nombre d'interventions et de nouveaux dossiers créés par la cellule d'appui logistique du siège	

1. HISTORIQUE

Dans le cadre de l'application de son programme de restructuration du système économique, le Gouvernement de la République du Mali a décidé de mettre en oeuvre la restructuration des sociétés et entreprises d'Etat et, par suite, de réduire considérablement les effectifs employés par ces organismes.

Plus de 7.500 personnes devaient ainsi quitter les organismes para-publics et se trouver disponibles sur le marché du travail, ne pouvant être reprises dans la Fonction Publique dont le recrutement est, dès lors, bloqué. A ce nombre s'ajoutent 9.400 diplômés ne trouvant de débouchés ni dans la Fonction Publique, ni dans les entreprises privées existantes dont les performances n'autorisent pas le recrutement de personnel additionnel.

Afin de remédier à ce problème, le Gouvernement a décidé de promouvoir le développement de l'emploi par le soutien et l'encouragement de l'initiative privée notamment dans la création des PME. A cet effet, il se propose d'étudier, d'adopter et d'appliquer des mesures fiscales, douanières et bancaires qui devraient stimuler et faciliter la création d'entreprises par les particuliers.

Pour mener à bien cette politique, le Gouvernement bénéficiera de l'assistance de l'USAID, dans le cadre du Programme de Réforme Economique; pour un montant de 18 millions de dollars E.U., et du FED à concurrence de 2.130.000 ECU. L'assistance du FED, consistera en la fourniture d'une assistance technique, d'une ligne de crédit et de ressources pour la formation et l'appui logistique à la réalisation d'une opération ayant pour objectifs, d'une part la création de 50 PME à Ségou et 50 autres à Sikasso et, d'autre part, l'intégration de 400 jeunes diplômés dans un programme de stages pratiques visant à favoriser leur insertion dans le système de production et leur faire acquérir les connaissances nécessaires à leur installation durable.

Dans sa conception, le Projet FED devait mobiliser, par le biais d'un bureau d'études spécialisé, une équipe multidisciplinaire d'experts internationaux comportant des spécialistes en création d'entreprises, en appui bancaire, en formation et, également en appui technologique; ce dernier n'était prévu que pour une durée limitée au démarrage du projet. Outre son objectif direct de création d'entreprises, et d'emplois, le projet FED orientera sa stratégie dans la formation de personnel malien à cette approche de façon à ce que, dans les meilleurs délais, ce personnel soit à même de constituer des

groupes de consultants privés susceptibles de se substituer progressivement aux experts internationaux et d'étendre ce processus à d'autres zones à l'intérieur du Mali. C'est ainsi que, début Novembre 1987, le FED a lancé au Mali le programme de création d'emplois basé sur le développement du secteur privé et en particulier du secteur des PME. Dès le début de la mise en oeuvre de ce projet, il est apparu que les aspects purement techniques et technologiques n'avaient pas été suffisamment pris en considération dans les termes de référence.

Pour combler cette insuffisance et compte tenu des difficultés de remettre en cause les budgets prévus pour la réalisation du projet, la représentation de la CE a suggéré aux autorités maliennes de requérir une intervention du PNUD dont une des agences d'exécution, l'ONUDI, est spécialisée en la matière. Cette requête a abouti à la mise en oeuvre du projet DP/MLI/85/011 qui est devenu opérationnel dès février 88; il consistait à mettre à disposition du projet FED, les services d'un technologue pour une période initiale de 2 ans.

Une étroite collaboration devait nécessairement être établie entre l'expertise à fournir par le projet PNUD/ONUDI et les experts de la firme financée par le FED, le projet PNUD/ONUDI devant prendre le relais du projet FED là où des entrepreneurs industriels ont été identifiés. En pratique, les experts des deux projets couvriront les mêmes zones d'activités : Ségou, Sikasso et Bamako et partageront les mêmes bureaux. Ils devront donc avoir des vues compatibles sur la manière de créer des entreprises et partager leur expérience et leurs informations. D'autre part le consultant ONUDI devra pouvoir compter sur un réseau d'informations technologiques qui lui permettra d'apporter aux entreprises non seulement son expérience personnelle mais aussi toutes les données pertinentes sur les variantes technologiques et les équipements les plus adaptés. Ce consultant devra aussi pouvoir faire appel à ce réseau d'informations pour trouver des partenaires techniques éventuels qui renforceront les nouvelles entreprises. Comme il s'agit d'un projet exécuté par l'ONUDI, le consultant pourra également avoir accès aux banques de données techniques rassemblées par le service d'informations industrielles de l'ONUDI.

Suite à l'impact positif des projets associés du FED et de l'ONUDI, on a pu enregistrer un développement inattendu dès la première année de sa mise en oeuvre, développement qui s'est traduit non seulement par une augmentation importante du nombre des dossiers traités impliquant une croissance continue du volume de travail à fournir mais aussi par une dispersion considérable des projets

dans les aires géographiques nécessitant de longs déplacements vers les sites d'implantation. C'est ainsi qu'il a été décidé d'augmenter les prestations de l'expertise ONUDI: d'une part par la mise en place d'un second technologue sur le terrain et d'autre part en organisant, à partir du siège du Consultant, un appui logistique permanent destiné à fournir au projet toutes les informations utiles en ce qui concerne les fournisseurs d'équipement adaptés aux conditions locales.

Cette nouvelle phase (avenant n°1 au contrat) a démarré en octobre 89.

Depuis, trois avenants complémentaires (nos 2, 3 et 4) et un nouveau contrat et son avenant ont permis d'assurer la continuité de l'appui technologique et de prolonger le projet parallèlement aux extensions successives accordées au projet FED en attendant la mise au point d'un nouveau document de projet, prévoyant la mise en oeuvre d'un "Programme Cadre de Dynamisation du Secteur Privé au Mali", élaboré par le PNUD et qui devra intégrer la phase 2 du présent projet.

A l'origine, le projet ONUDI/PNUD était essentiellement orienté vers l'appui au projet FED. Au cours du temps, et par le biais des réunions mensuelles tenues par le Secrétariat de Coordination du PNUD, il est apparu que d'autres projets de promotion des PME ne disposaient pas non plus d'appui technologique, et qu'une collaboration avec le présent projet pourrait être bénéfique. C'est ainsi qu'une assistance formelle s'est instaurée en faveur du projet PNUD/BIT depuis le mois de mai 1991.

Le présent document constitue le rapport final du projet DP/MLI/85/011 qui vient à échéance le 07.02.93.

2. SYNTHESE

Les résultats obtenus à ce jour, après 56 mois d'activité, par l'équipe de trois experts, réduite actuellement à deux, et quatre technologues maliens sont:

- dossiers étudiés :	832
- assistance à la réalisation de projets :	376
- investissements correspondants (en CFA) :		3.263.205.000
- emplois créés :	1.538
- appui logistique Siège:		
interventions en choix équipements :	172
- nouveaux dossiers	99

D'autre part, l'importance des interventions du projet PNUD/ONUDI par rapport aux activités du projet FED se reflète dans le tableau ci-après :

Nature des Interventions	Projet ONUDI	Projet FED	Rapport (%)
- Dossiers étudiés	754	2152	22
- Entreprises créées	365	629	50
- Emplois créés	1.475	2455	55
- Investissements	3.119.444.794	4.030.089.726	63

Les graphiques du nombre cumulé des interventions du projet ONUDI, mis à jour à la date du 31 décembre dernier, est joint en annexe 1, tandis que l'importance relative des prestations et des interventions du projet ONUDI, assurant le volet d'assistance technique, par rapport aux activités du projet FED, est présenté en annexe 2 sous forme de tableau chiffré et sous forme de graphiques séparés.

Notons enfin que l'appui du siège a été particulièrement sollicité (22% de dossiers étudiée pendant cette période) tant quantitativement que, parfois, par l'originalité des demandes (recherches de données et de renseignements sur du matériel de foire, élevage d'autruches, etc...).

3. LES PROBLEMES D'APPUI AU DEVELOPPEMENT (Contexte, PME/PMI)

Les opérateurs économiques ont mis en évidence les insuffisances des structures d'appui et des organismes de prestations de service oeuvrant pour le développement du secteur privé, soulignant le manque de bureaux d'études privés compétents, d'organismes de formation fiables, de services d'appui aux petites entreprises et au secteur informel, et de produits financiers adaptés aux besoins des petites entreprises.

Ces petites entreprises reposent essentiellement sur le savoir-faire et sur la volonté de réussite de l'entrepreneur. Evaluer un dossier de création ou de développement d'une petite entreprise revient toujours à estimer les compétences professionnelles et le dynamisme du chef d'entreprise par rapport à la nature des activités envisagées. L'expérience professionnelle et le vécu dans des entreprises similaires sont toujours des critères favorables pour les organismes de financement. Compte tenu de leur taille modeste, ces petites entreprises ne nécessitent de la part de l'entrepreneur qu'un apport initial faible, et de ce fait la grande majorité des entreprises créées dans les dernières années sont des petites entreprises. C'est pourquoi le gouvernement attache une importance toute particulière à cette catégorie de bénéficiaires. En favorisant la création et le développement de petites entreprises sur tout le territoire national, le gouvernement cherche aussi à déconcentrer les activités économiques et à régionaliser les emplois qui seront créés.

Bien que toutes les sources de financement pour PME/PMI leur soient théoriquement accessibles, ces petites entreprises sont confrontées à un triple handicap: à frais fixes, par dossier égal et avec marges identiques, les banques préfèrent prêter une fois 80 millions de FCFA plutôt que 20 fois 4 million de FCFA; de plus, les banques savent apprécier la rentabilité et les risques qui reposent sur un projet lié à un processus de fabrication mais elles sont démunies pour apprécier les risques représentés par la valeur humaine des petits entrepreneurs ; enfin les petits entrepreneurs, en général, n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un bureau de conseil. C'est pourquoi il était indispensable, pour faire naître un nombre important de petites entreprises dont certaines deviendront moyennes, de mettre en place des structures d'appui dans tout le pays, dont le projet MLI/85/011 "Choix de technologies appropriées pour les nouvelles entreprises industrielles", représente pratiquement la seule initiative qui ait pu montrer une efficacité certaine.

Notons également que le développement, et la survie des PME au Mali est lourdement

handicapé par le manque de formation de la plupart des entrepreneurs. Cette circonstance induit un manque généralisé de professionnalisme qui est flagrant au niveau gestion et non négligeable au point de vue technique pour beaucoup d'entre eux.

4. DEROULEMENT DU PROJET

01/11/87

1. Début novembre 1987, le projet FED, - ayant pour objectif "l'insertion des jeunes diplômés et la réinsertion professionnelle des volontaires au départ de la fonction publique par la promotion et la création de nouvelles PME" - devient opérationnel par la création de trois antennes, respectivement à Bamako, Ségou et Sikasso, couvrant ainsi toute la région sud du Mali (création Sikasso 23/10/87; création Bamako et Ségou 11/11/87).

11/02/88

2. Un projet d'assistance technologique et technique en faveur des PME/PMI financées par le projet FED, décidé dans le cadre d'une convention tripartite PNUD-ONUDI- Gouvernement malien, devient opérationnel mi-février 1988 par l'envoi d'un technologue au sein de l'antenne de Ségou, choix justifié par la situation géographique de la région d'intervention à couvrir. Très rapidement, le technologue est sollicité par les deux autres antennes pour intervenir dans la constitution des dossiers et dans le suivi de projets.

01/12/88

3. Les spécificités locales de l'antenne de Ségou, font ressortir une forte proportion de projets du type agro-pastoral, impliquant l'opportunité de l'assistance d'un expert agronome pour étudier et suivre les dossiers liés à des activités de culture et d'élevage. Des démarches sont entreprises par le chef d'antenne de Ségou auprès du PNUD pour obtenir un appui technologique dans ce domaine. La requête ayant été favorablement reçue par le PNUD/ONUDI, un expert agronome, M. Le Troquer, est recruté localement le 01/12/88 (payé par l'ONUDI) pour être affecté à l'antenne de Ségou.

Fin 1988

4. Le nombre important des dossiers à traiter par le technologue, le nombre croissant des projets à suivre et à contrôler, démontre rapidement l'insuffisance des moyens et de l'effectif du projet PNUD/ONUDI mis en place. Un rapport d'évaluation intermédiaire du projet FED apporte des recommandations pour le renforcement de l'assistance technique. Il fait ressortir l'impact bénéfique que le projet PNUD/ONUDI a sur l'ensemble des activités de promotion de la PME.

01/10/89

5. Par un avenant au projet initial PNUD/ONUDI, un deuxième technologue arrive sur le terrain le 01/10/89 pour aider M. De Waen dans ses tâches multiples. Ses prestations sont prévues pour une durée de 9 mois. Simultanément, compte tenu des besoins sans cesse croissants d'informations technologiques et de contacts avec les fournisseurs d'équipements, les moyens opérationnels du projet sont renforcés par une action d'appui logistique à partir du siège du Consultant. Enfin, compte tenu du fait que les autorités locales n'ont pas été à même d'affecter des techniciens maliens au projet, l'avenant prévoit l'engagement et le financement par le projet de deux technologues maliens.

15/11/89

6. Création par le projet FED d'une nouvelle antenne à Mopti en date du 15/11/89, nécessitant une réorganisation de l'équipe PNUD/ONUDI et une nouvelle extension de leurs activités.

24/01/90

- 6bis La revue tripartite annuelle enregistre le retard apporté à l'intégration d'homologues et s'inquiète de ce que l'assistance technique viendra prendre fin à brève échéance. Devant les délais découlant des procédures du PNUD, le représentant de l'ONUDI propose de mobiliser des fonds disponibles sur la Décade pour le Développement Industriel en Afrique (budget ONUDI) afin d'éviter une rupture dans les activités. Cette soudure est proposée dans l'hypothèse que le PNUD prolongera le financement du projet sur la programmation 1991 du CIP.

15/02/90

7. Expiration du contrat initial, impliquant la fin des activités du technologue principal M. De Waen, et mettant la continuité du projet en danger (mi-février 1990).

31/05/90

8. Expiration du contrat du deuxième technologue, couvert par l'avenant n° 1 au projet.

La continuité du programme d'assistance couvert par le projet PNUD/ONUDI est assurée pour une période de sept mois, venant à expiration à la mi-février 1991, incluant les deux technologues, les homologues maliens (avenant n° 2) et l'appui technique du siège. Ce financement est apporté par des fonds propres de l'ONUDI (XA/MLI/90/625).

28/11/90

- 8bis Revue tripartite. Prolongement du projet jusqu'au 31 décembre 1991, en deux temps :

- i) 4 à 5 mois avec maintien des moyens actuels;
- ii) sous réserve de l'approbation du siège, accroissement des moyens pour tenir compte de l'ouverture des antennes du projet FED à Kayes et Tombouctou.

12/90 à 03/91

9. Création de deux nouvelles antennes par le projet FED, une à Tombouctou en décembre 1990 et une à Kayes en janvier 1991, devenant opérationnelles respectivement en janvier et mars 1991.

Cette nouvelle extension des activités FED nécessite une réorganisation totale de la cellule d'intervention du projet PNUD/ONUDI, et se concrétise par l'affectation des homologues maliens en formation aux antennes de Bamako (M. Kassambara) et de Kayes (M. Lassine). Simultanément, recrutement de deux nouveaux homologues maliens pour renforcer l'équipe et pour pouvoir répondre aux besoins nouveaux.

15/02/91

10. Expiration de la période de prolongation du projet PNUD/ONUDI à la date du 15/02/91 mettant en danger la continuité du projet, qui est de plus en plus sollicité par les activités sans cesse croissantes du projet FED.

31/05/91

11. Un financement additionnel du PNUD permet de financer la prolongation du projet PNUD/ONUDI pour une période de 2 mois et 10 jours, expirant à la fin du mois de mai 1991 (31/05/91 : avenant n° 3). Ce délai supplémentaire devait en principe permettre d'entamer les procédures nécessaires pour le renouvellement et la mise en place d'un nouveau projet, assurant la continuité de l'appui technologique au projet PME et aux promoteurs potentiels pouvant bénéficier d'un financement FED.

01/06/91 - 31/07/91

12. Rupture de projet PNUD/ONUDI à la date du 31/05/91 (fin avenant n° 3) avec un risque évident de perdre tous les bénéfices des acquis réalisés par le projet jusqu'à cette date.

Une procédure de demande de financement pour la prolongation du projet, dont l'impact est difficile à mettre en doute, avait été entamée par la représentation locale du PNUD auprès de son siège à New York durant la période du 15/02/91 au 31/05/91 afin d'assurer la continuité du projet.

Des accords de principe exprimés par le bailleur de fonds envers le consultant sous-traitant, amènent ce dernier à s'engager dans le financement des technologues maliens et de l'infrastructure locale durant la période de rupture que l'on espère relativement courte afin de ne pas perdre les acquis réalisés, notamment, et surtout, la collaboration des technologues maliens pour lesquels le projet a déjà consenti une longue période de formation.

13. Rupture virtuelle des activités du projet entre le 31/05/91 et le 28/07/91.
Durant cette période, les techniciens maliens, répartis sur les antennes Ségou, Sikasso, Bamako et Kayes ont continué leurs activités d'assistance technique sur financement du consultant dont les experts sont rentrés en Europe.

01/08/91

14. La signature de l'avenant n° 4 au projet PNUD/ONUDI a permis aux technologues et à l'appui logistique du siège de reprendre les activités au début du mois d'août 1991 pour une période de 7 mois, expirant à la fin du mois de février 92. L'investissement du Consultant a permis d'assurer la continuité du projet.

16/09/91

15. Au cours du mois de septembre 1991, une mission d'évaluation tripartite (PNUD/ONUDI/Gouvernement malien) procède à une analyse de l'impact du projet, de son évolution et des résultats obtenus afin de déterminer l'opportunité de continuer l'action engagée et de définir les différentes options valables et concrètes sous lesquelles cette action pourrait éventuellement se poursuivre.

15/11/91

16. Un programme cadre de dynamisation du secteur Privé au Mali MLI/91/004 à été formulé; les activités relatives à l'appui technologique y sont incluses.

01/03/92

17. En attendant l'approbation du programme cadre et pour éviter un nouvel arrêt des activités d'appui et de suivi des promoteurs, un appel d'offre restreint à été lancé et a abouti à la signature d'un nouveau contrat avec Sorca-BMB. Il sera effectif jusqu'au 30/06/92

18. Rupture virtuelle des activités du projet entre le 01/07/92 et le 20/08/92. Durant cette période, deux techniciens maliens, répartis sur les antennes Ségou, Sikasso, Bamako et Kayes ont continué leurs activités d'assistance technique.

20/08/92

19. La signature de l'avenant n° 1 au deuxième contrat a permis aux technologues et à l'appui logistique du siège de reprendre les activités fin août 1992 pour une période de 5 mois, expirant à la fin du mois de janvier 93.

31/01/93

20. Fin du projet et démarrage du programme cadre.

5. RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET

5.1. Objectifs

- 5.1.1. Apporter un appui direct aux promoteurs/entrepreneurs assistés par le projet FED, puis PNUD/BIT, dans l'identification et l'évaluation des technologies appropriées, nécessaires à la constitution de dossiers bancables à financer sur les lignes de crédit relevant respectivement du FED et de la BIRD.
- 5.1.2. Assister les promoteurs/entrepreneurs ayant obtenu le financement FED (ou un autre financement dans le cadre du projet PNUD/BIT) de leur projet, dans la mise en place des équipements et la gestion technique en vue d'assurer la viabilité et la rentabilité des PMI concernées.
- 5.1.3. Assurer la formation des entrepreneurs et des quatre ingénieurs maliens affectés par le projet à Ségou et Sikasso, Bamako et Mopti dans la maîtrise du choix technologique et la gestion de la production.
- 5.1.4. Assurer la mise en place et l'exécution d'un système d'entretien préventif technique des équipements.

5.2. Résultats attendus cumulés (de février 1988 à janvier 1993)

- 5.2.1. 310 dossiers de projet PMI étudiés.
- 5.2.2. 140 PMI créées. La vérification quantitative de ce résultat se fera par le taux moyen de remboursement des prêts consentis par le FED aux 140 PMI concernées et par le nombre d'emplois créés, estimés entre 100 et 150.
- 5.2.3. 140 entrepreneurs formés sur le tas et si nécessaire par le biais de séminaires techniques, maîtrisant dans leur spécialité le réglage et la maintenance de leurs machines et la gestion de la production; 4 ingénieurs maliens affectés à Ségou et Sikasso, Bamako et Kayes, capables de seconder efficacement et de remplacer éventuellement les experts

internationaux du projet.

5.2.4. 140 entreprises suivies.

5.3. Résultats obtenus

Les résultats globaux depuis le démarrage initial du projet DP/MLI/85/011 jusqu'en fin octobre 1992 (donc un mois avant la fin du projet) ont dépassé largement les estimations du document de projet:

Nombre de dossiers étudiés : 832
Nombre de projets réalisés : 372
Montant des investissements réalisés en CFA :	3.263.205.000
Nombre d'emplois créés : 1.538
Nombre de projets suivis : 433

Les résultats attendus et les résultats obtenus par période des contrats et avenants sont résumés dans l'annexe 3.

5.4. Dossiers étudiés, analysés et suivis

L'équipe des technologues et les ingénieurs maliens ont fourni une assistance régulière ou ponctuelle à 832 projets, dont 66 dossiers nous ont été confiés par le projet BIT.

Les projets assistés ayant un contenu technique important sont:

- BKO-888 Atelier d'alésage
- KYS-038 Boulangerie
- SGU-046 Rechapage de pneus (prise en charge de la gestion technique pour cause de décès du promoteur)
- SGU-166 Garage
- SGU-545 Mini-laiterie
- SGU-750 Labo-photo
- SGU-756 Extraction de sable et de gravier (conception, conseil auprès du constructeur du chaland et suivi des travaux de construction)

- SGU-809 Imprimerie (réception du matériel et mise en marche)
- SGU-916 Boulangerie (organisation d'un appel d'offres, installation et mise en marche)
- SGU-1019 Elevage de boeufs (400 têtes)
- SKO-017 Mini-laiterie
- SKO-042-4 Atelier de tissage
- SKO-114 Forge de Niéna.

L'annexe 4 reprend une liste détaillée de l'ensemble des projets PME/PMI, mise à jour le 31 décembre 1992, auxquels l'équipe du projet a prêté une assistance ponctuelle ou constante. Les unités ayant bénéficié d'une intervention durant la période couverte par le présent rapport sont répertoriées par la mention " 1a5 et 2a5 " dans la colonne "Rapports" du tableau.

Cette liste détaillée comporte les indications suivantes:

- le numéro du dossier si un dossier a été ouvert,
- le nom du projet,
- le secteur d'activité concerné:

Commerce, enseignement et santé = ens. santé, industrie alimentaire = ind. ali, industrie électrique, mécanique, bâtiment et chimique = ind. embc, industrie textile = ind. tex, production animale = prod. ani, production végétale = prod. vég et services.

- le lieu d'implantation,
- la ou les périodes, durant lesquelles le projet de PME/PMI a bénéficié d'une assistance de la part du Projet, indiquées par la mention se rapportant au(x) rapport(s) d'activité correspondant(s) à celles-ci:

- contrat de base = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- avenant n° 1 = 2a1, 2a1, 3a1
- avenant n° 2 = 1a2, 2a2, 3a2
- avenant n° 3 = a3
- avenant n° 4 = 1a4, 2a4
- deuxième contrat = 1a5, 2a5
- avenant n° 1 = 1a6, 2a6
- activités agronome = . . . A1, A2, A3, A4, A5, A6

- les investissements consentis par le projet,
- les interventions des experts (les astérisques signifient qu'une assistance a été demandée au siège),
- le nombre d'emplois créés,
- les remarques sur le projet.

5.5. Conclusions

Comme nous pouvons le remarquer en consultant les chiffres précités, la plupart des objectifs retenus par le présent contrat ont été atteints et même largement dépassés.

5.6. Formation

La formation de cadres et de techniciens nationaux compétents étant un des aspects essentiels de tout projet d'assistance, permettant de préserver les acquis réalisés et de garantir la continuité des activités du projet lorsque celui-ci vient à expiration, cette action constitue, depuis le début, un élément de base du contrat des prestations et un des objectifs à réaliser durant l'exécution du présent projet.

Dans cet esprit, les deux technologues maliens Messieurs Kassambara et Traore (ayant une formation d'ingénieur électro-mécanicien de l'ENI Bamako), recrutés par le Consultant après avis favorable du PNUD et de l'ONUDI, ont bénéficié d'une formation continue en travaillant aux côtés des experts Messieurs De Waen et Van de Veer. Ils ont pu accompagner, dès le début de leurs prestations, les technologues sur le terrain dans le cadre des interventions d'assistance et de conseil auprès des entrepreneurs. Graduellement, ils ont participé à toutes les tâches dévolues aux experts en technologies dans le cadre de l'exécution du projet.

Ayant complété leur formation sur le tas en février 1991, après une année de stage, ils ont depuis lors été détachés auprès des antennes de Kayes et de Bamako, où ils assument la responsabilité de l'assistance technique, assurant l'instruction et le suivi des nouveaux dossiers, et les visites de suivi sur le terrain des entreprises rentrées en production. Ils sont toujours régulièrement suivis par les technologues, qui contrôlent la qualité de leurs prestations, les orientent dans leur travail et leur donnent des conseils dans l'exécution de leurs tâches.

En mars 1991, deux nouveaux ingénieurs maliens, MM. Sangaré et Konaré ont été recrutés. Ils ont commencé leur formation sur le tas avec MM. De Waen à Ségou et Van de Veer à Sikasso, qui devait se terminer le 28 février 1992. Il était initialement prévu que les 4 techniciens maliens ayant bénéficié de cette formation, prennent en charge les activités d'assistance technique des antennes de Bamako, Kayes et Mopti et qu'on procède au recrutement de deux nouveaux techniciens, qui travailleraient durant leur stage de formation sous le contrôle direct des experts technologues aux antennes de Ségou et de Sikasso.

Les développements récents de l'évolution du présent projet, sa nouvelle prolongation de courte durée et le retard accusé pour l'approbation du nouveau projet "Programme Cadre" dont il fera partie, a entravé le recrutement programmé des deux nouveaux techniciens. Aussi la décision de réaffectation des techniciens MM. Sangaré et Konaré a été remise à une date ultérieure. En attendant le moment opportun pour recruter leurs remplaçants, ils restent stationnés à Ségou et Sikasso, où ils continuent à perfectionner leurs connaissances.

5.7. Banque de données

Depuis le début du projet, l'équipe en charge de l'appui technologique a collecté de nombreuses informations relatives au matériel utilisé ou préconisé. Elles couvrent les domaines de la documentation technique, des procédés de fabrication, des équipements de production, des prix (factures pro forma), des manuels d'entretien, des adresses de fournisseurs, etc. Une correspondance suivie avec le siège permet de compléter régulièrement cette base de données qui couvre actuellement une cinquantaine de techniques, dont :

- préparation d'aliments pour bétail,
- équipements pour boulangerie,
- équipements pour mini-laiterie,
- matériel pour atelier de couture,
- la fabrication de glace,
- installations de froid,
- fabrication de jus de fruits,
- équipements pour labos de photographie,
- fabrication de sachets en plastique,
- renseignements sur panneaux solaires,
- équipements pour ateliers mécaniques,

- matériel pour ateliers de soudure,
- équipements pour la fabrication de trombones, agrafes,
- équipements pour la fabrication de clous,
- équipements et matériel pour fonderie,
- équipements pour la production de bonbons, etc.

A ce jour, le répertoire contient déjà les adresses et autres informations relatives aux techniques et aux fournisseurs de plus de 400 équipements divers. Dans le cadre de cette collecte d'informations, l'appui du siège se montre particulièrement précieux.

De plus, depuis la réception d'équipements informatiques performants en décembre dernier, le CTP a commencé à introduire ces nombreuses données et renseignements dans une banque de données informatisée, qui permettra leur utilisation d'une manière efficace dans le futur.

5.8 Appui logistique

En octobre 1989, après 18 mois d'activités, un renforcement du programme d'assistance en faveur du projet FED, justifié par le volume des demandes d'interventions et par l'impact positif que dégage le projet, est décidé et rendu effectif par l'avenant n° 1 au contrat initial. En plus du renforcement de l'équipe des technologues sur le terrain, un volet d'**appui logistique** a été mis en oeuvre, ayant comme tâche principale de rechercher et de collecter les renseignements, informations et documentations techniques dont les experts technologues sur le terrain ont besoin dans le cadre de leurs activités d'assistance auprès des promoteurs, et d'établir et maintenir les contacts avec les fournisseurs et fabricants d'équipements susceptibles d'être sollicités.

En effet, l'expérience des 18 premiers mois d'activité avait démontré les énormes difficultés que le technologue rencontrait sur le terrain dans la recherche et la collecte de données et d'informations fiables. Souvent d'ailleurs, les renseignements n'étaient pas disponibles et le nombre d'agences de représentation de fabricants de matériel et d'équipements étant fort réduit, il s'avérait la plupart du temps impossible de trouver et de prendre contact avec ces derniers.

Depuis cette date et jusqu'à ce jour, la cellule assurant l'appui logistique a effectué au total 177 interventions diverses et constitué 101 nouveaux dossiers, contenant essentiellement de la documentation sur des équipements de production, des noms de

fournisseurs et de fabricants, des factures pro-forma pour du matériel, des équipements, de l'outillage et des matières premières et consommables. D'autre part, la cellule établit et maintient les contacts avec les fournisseurs potentiels et assure le rôle de liaison entre ceux-ci et les technologues sur le terrain.

De plus, 8 missions bisannuelles de coordination et de suivi de l'appui logistique ont été réalisées sur le terrain, durant lesquelles l'expert a pris contact avec tous les opérateurs économiques liés au projet et au programme de promotion du secteur des PME/PMI, et a visité de nombreuses unités, entrées en activité et ayant bénéficié de l'assistance du présent projet. Il a en outre profité de son passage dans les antennes pour y assumer divers séminaires de formation en analyse de projets, en études de factibilité et en gestion d'entreprises.

Un tableau chiffré joint en annexe 5, donne le nombre cumulé des interventions et des nouveaux dossiers traités par la cellule assurant l'appui logistique et montrent leur évolution dans le temps depuis le démarrage de ce volet.

6. COOPERATION AVEC LES PROJETS FED et BIT

6.1. Projet FED

Depuis le début de cette année, l'équipe d'assistance du projet FED est réduite à deux experts internationaux. L'entente entre les équipes des deux projets FED et ONUDI reste excellente. Les contacts permanents et les réunions de travail régulières, tant au niveau des antennes qu'au niveau de la direction des deux projets, permettent de coordonner les interventions et d'assurer la complémentarité des actions d'assistance d'une façon harmonieuse. La présence des techniciens aux Comités de Crédit, tenus par le projet FED dans les différentes antennes, permet à ceux-ci de suivre le dénouement des dossiers et favorise énormément l'entente et le travail en commun des deux équipes.

Notons d'autre part que les responsables du projet FED insistent de plus en plus sur une intervention systématique de l'équipe technique pour **chaque** dossier et souhaite que les avis, remarques et conseils émis par celle-ci soient repris dans les dossiers soumis aux Comités de Crédit. Cette coopération sans problème favorise la réalisation des actions préconisées, augmente l'efficacité du fonctionnement de ce co-projet et contribue à son succès.

6.2. Projet PNUD/BIT

Une assistance formelle s'est instaurée en faveur du projet PNUD/BIT, à sa requête, depuis le mois de mai 1991; depuis cette date, le technologue national en poste à Bamako, sous supervision de l'expert, consacrait un jour par semaine à l'assistance aux projets étudiés par le Projet PNUD/BIT; le volume des projets montés par cette agence ayant considérablement augmenté, il a fallu accroître ces prestations à 2 jours par semaine. L'assistance du technologue au projet PNUD/BIT est jugée indispensable par le CTP de cette mission.

Notons enfin que, par le biais du projet PNUD/BIT qui traite également des dossiers devant être financés par le Centre Français de Coopération, le Projet PNUD/ONUDI a donc aussi prêté son assistance à des projets financés par cette Caisse.

7. CONSTATATIONS ET LECONS A TIRER

L'expertise technique est jugée indispensable par tous; les banquiers rencontrés sont unanimes pour considérer l'assistance technique et le suivi de gestion essentiels à la réussite d'un projet. Cependant aucun d'entre eux n'est prêt ou en mesure d'y contribuer d'une façon ou d'une autre.

Les bailleurs de fonds sont également convaincus de cette nécessité et sont tous intéressés par les prestations de la cellule ONUDI.

Les statistiques établies par le projet FED montrent qu'après deux ans, sur les entreprises créées:

30% fonctionnent de façon satisfaisante,

30% sont arrêtées ou condamnées,

40% survivent grâce au suivi qui leur est apporté régulièrement.

Mais le promoteur n'est ni prêt ni en mesure d'en supporter le coût; si cette expertise technique n'était pas imposée et prise en charge par les bailleurs de fonds, aucun promoteur ne serait demandeur pour qu'un suivi technique, pourtant essentiel au bon démarrage et au bon fonctionnement de son entreprise, soit effectué. Très peu accepteraient de payer le prix du dossier technique lors de l'établissement de son projet.

8. FUTUR DU PROJET

L'évolution du présent projet vers la création de Bureaux Conseils Techniques indépendants (un BCT par antenne ou par technologue), retenue comme objectif final, fait actuellement l'objet de discussions de concertation tant avec la CE qu'avec le PNUD. Ces bureaux, à créer en tant que petites entreprises privées, assisteront dans le futur les différentes antennes FED sur le plan technique, prendront la relève et assureront la pérennité du présent projet.


Néanmoins, certaines controverses sur le volume du marché potentiel, ont fait ressortir la nécessité d'entreprendre une étude de marché détaillée, afin d'avoir une garantie concernant leur viabilité. Pour cette raison, une mission spéciale d'un expert, financée par l'ONUDI, a eu lieu au mois de décembre 1992, pour évaluer le marché potentiel, déterminer le nombre de bureaux conseils privés (étude d'opportunité pour la création d'un ou plusieurs bureaux), leur composition et les possibilités d'intégration dans le contexte économique existant.

Il convient toutefois de faire remarquer que cette évolution qui devra, à terme, être totalement effective, ne dispensera pas dans l'immédiat le projet actuel de continuer la formation d'homologues et de poursuivre les efforts d'assistance, de contrôle et de suivi des technologues maliens pendant une période qui pourrait s'avérer encore longue. La formulation du Programme Cadre de Dynamisation du Secteur Privé au Mali (MLI/91/004) tient compte de cette situation : elle a prévu une prorogation des activités du Projet PNUD/ONUDI pour trois ans.


A N N E X E 1

Nombre cumulé d'interventions


Nombre des interventions trimestrielle du projet PNUD/ONUDI dans les projets: FED et PNUD/BIT

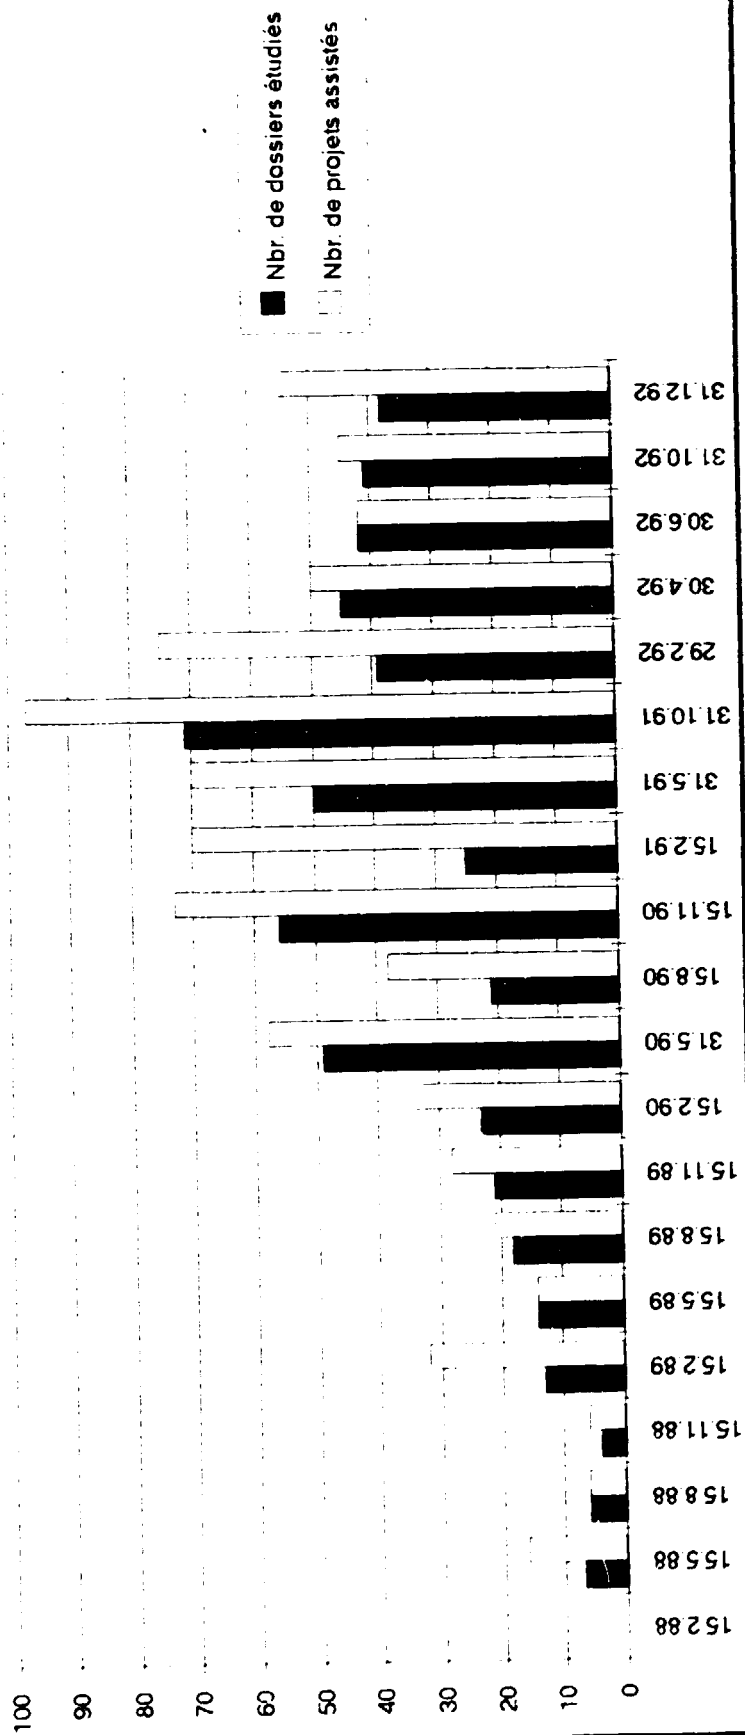

Nombre cumule des interventions du projet PNUD/ONUDI dans les projets; FED et PNUD/BIT

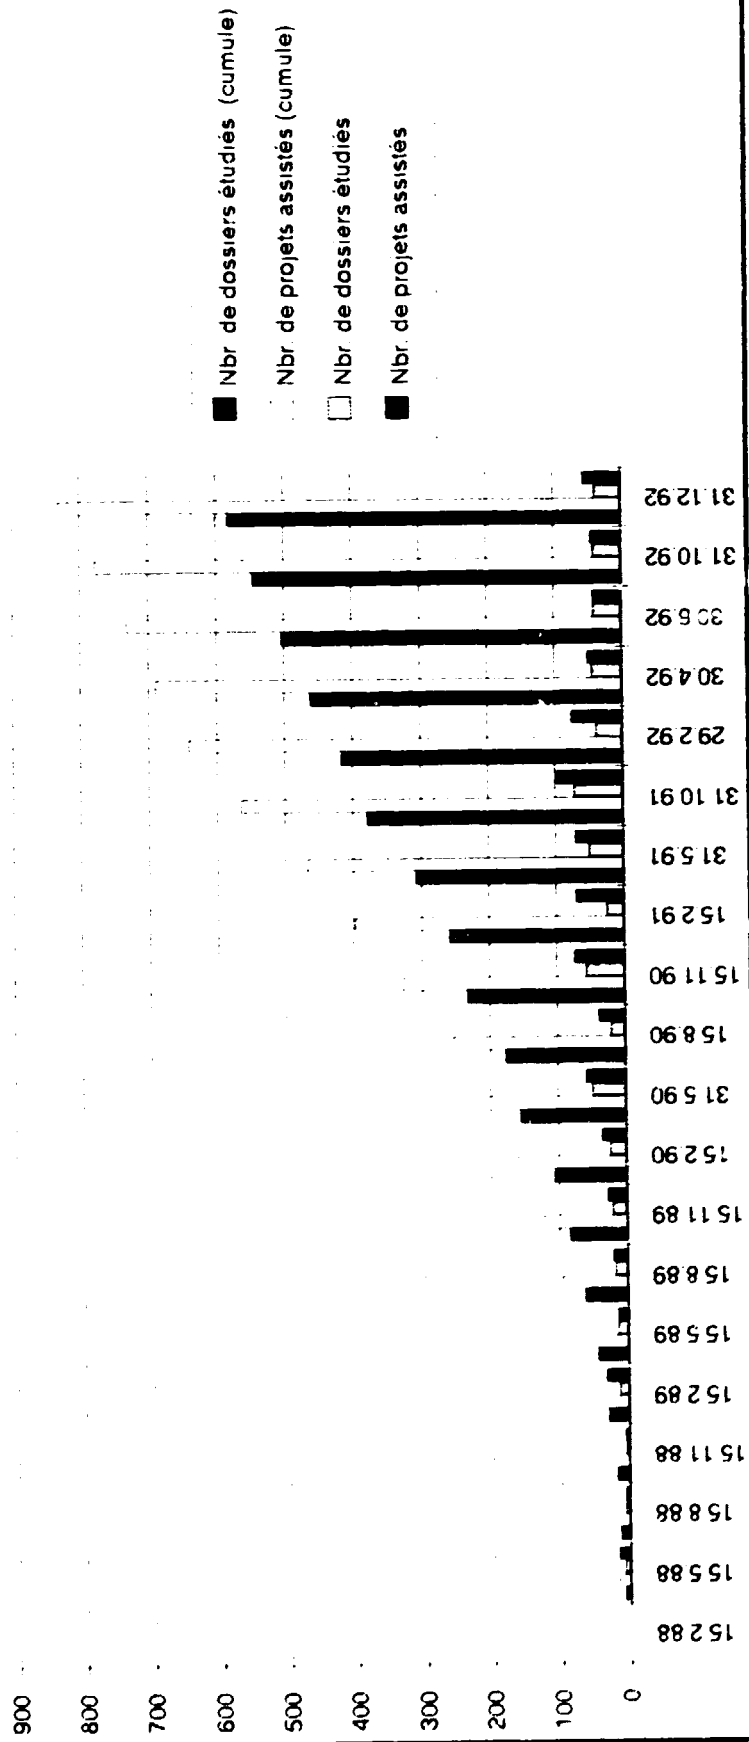

Nombre cumule des interventions du projet PNUD/ONUDI dans les projets; FED et PNUD/BIT

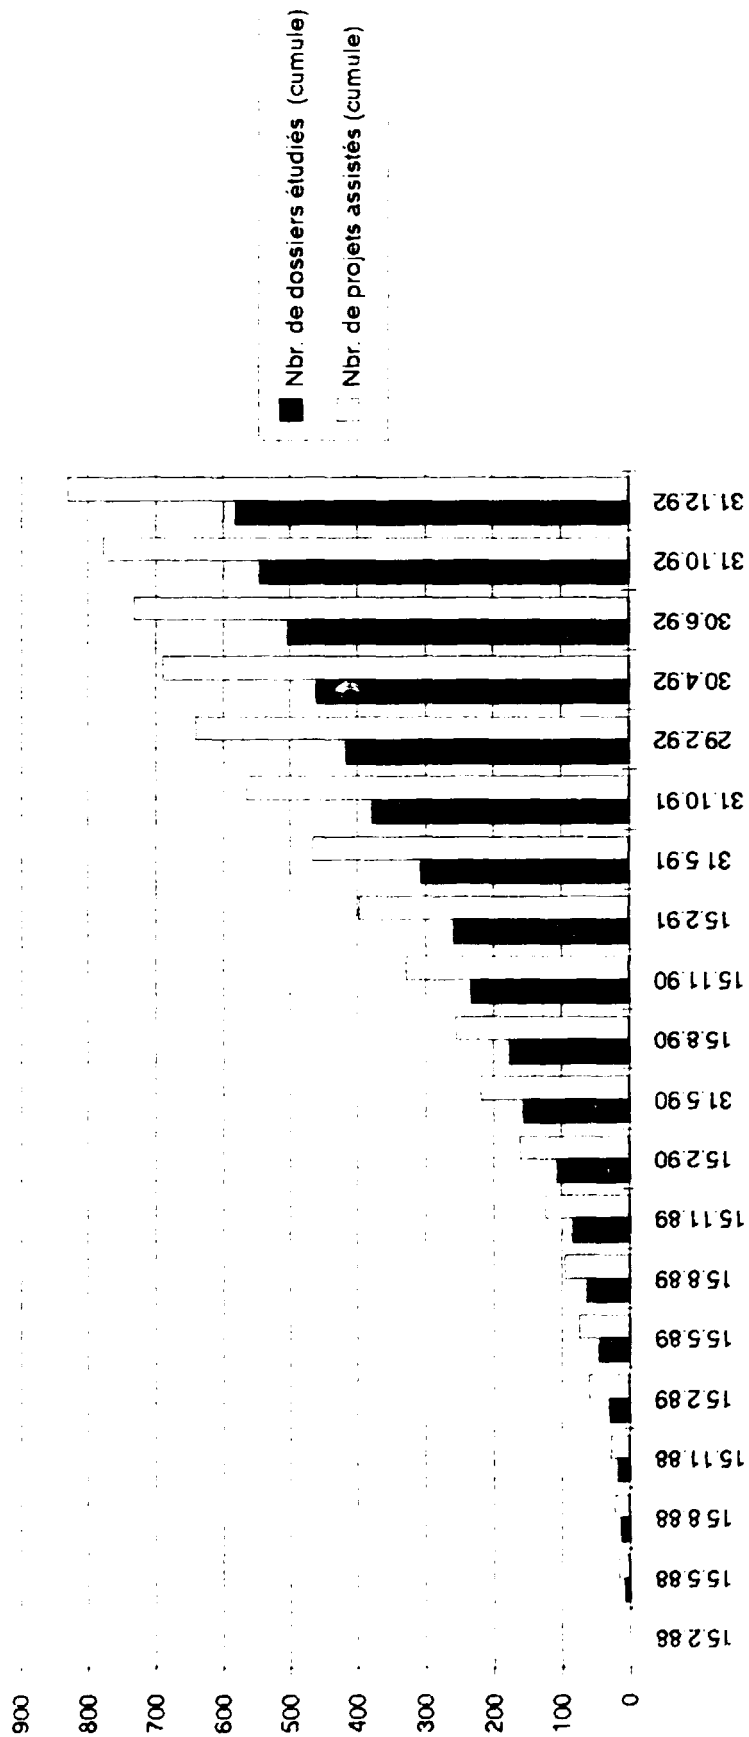

Entreprises du projet FED assistées par la cellule ONUDI

(par sous-secteur d'activité et par montant d'investissement au 31.10.92)

	TOTAL	%	Ens santé	Com	Service	Ind ali	Ind tex	Ind embc	Prod. veg.
< 1 000 000	16	6	1	2	2	1	4	4	2
1 à 5 mil.	143	49	7	15	19	32	11	38	21
5 à 10 mil	70	24	3	4	7	20	5	26	5
10 à 20 mil.	28	10	2	2	3	4	1	11	5
> 20 mil.	33	11	2	1	6	8	0	15	1
Total	290	100	15	24	37	65	21	94	34

Legende

Ens.santé = enseignement et santé

Com. = commerce


Ind.ali = industrie alimentaire

Ind. tex. = industrie textile

Ind. embc = industrie-électrique - mécanique - bâtiment - chimique

Prod. vég = production végétale

Distribution des projets par montant des investissements

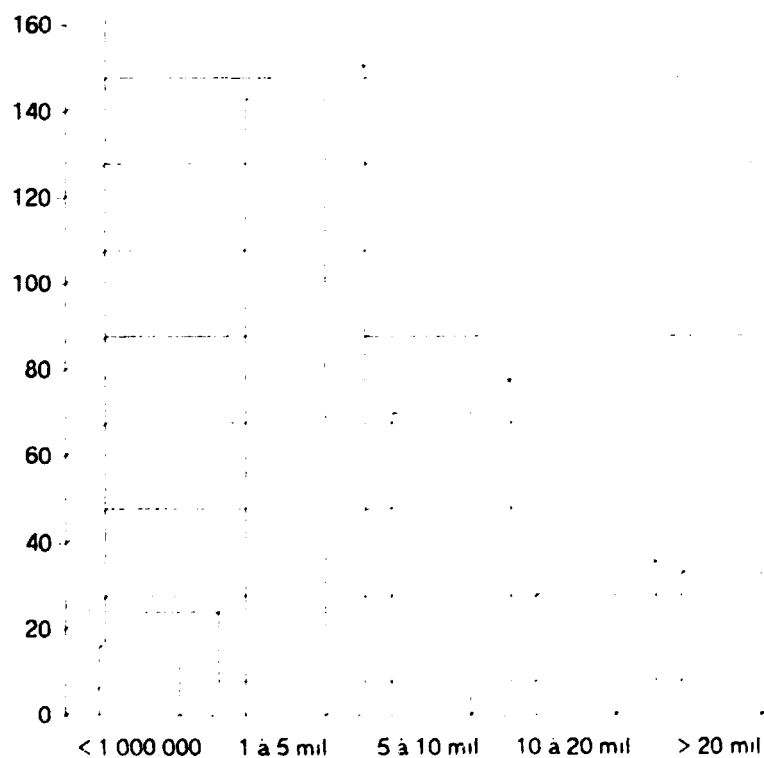

A N N E X E 2


Importance relative du projet ONUDI

dans le projet FED

RESUME DES RESULTATS OBTENUS PAR RAPPORT AU PROJET FED au 31.12.92


Antennes	Projet ONUD	Projet FED	Rapport ONUD/FED
BAMAKO			
Dossiers étudiés	155	931	17%
Dossiers financés	84	253	33%
Rapport dossiers financés/étudiés	54%	27%	
Investissements	813 733 662	1 836 557 491	44%
Emplois créés	344	1115	31%
KAYES			
Dossiers étudiés	51	92	55%
Dossiers financés	30	33	91%
Rapport dossiers financés/étudiés	59%	36%	
Investissements	251 654 624	258 555 325	97%
Emplois créés	114	118	97%
MOPTI			
Dossiers étudiés	122	340	36%
Dossiers financés	40	73	55%
Rapport dossiers financés/étudiés	33%	21%	
Investissements	304 029 580	398 635 040	76%
Emplois créés	181	262	69%
SEGOU			
Dossiers étudiés	246	1 230	20%
Dossiers financés	129	162	80%
Rapport dossiers financés/étudiés	52%	13%	
Investissements	1 015 896 444	1 177 752 345	86%
Emplois créés	475	595	80%
SIKASSO			
Dossiers étudiés	172	957	18%
Dossiers financés	79	141	56%
Rapport dossiers financés/étudiés	46%	15%	
Investissements	719 846 293	788 248 855	91%
Emplois créés	351	498	70%
TOMBOUCTOU			
Dossiers étudiés	8	210	4%
Dossiers financés	3	43	7%
Rapport dossiers financés/étudiés	38%	20%	
Investissements	14 284 191	223 783 652	6%
Emplois créés	10	164	6%
TOTAL			
Dossiers étudiés	754	3 760	20%
Dossiers financés	365	705	52%
Rapport dossiers financés/étudiés	48%	19%	
Investissements	3 119 444 794	4 683 532 708	67%
Emplois créés	1 475	2 752	54%

Interventions du projet ONUDI dans le projet FED en % par antenne

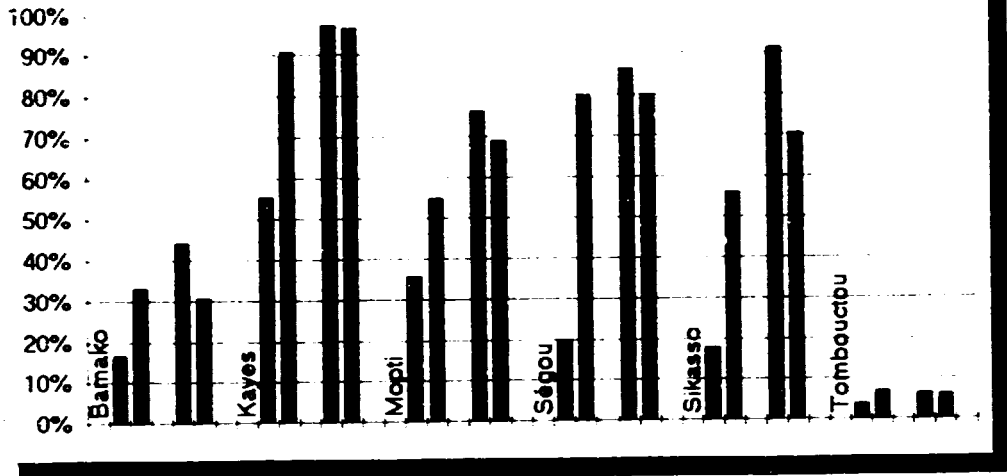

Dans les batonnets groupés par antenne le premier est le % des dossiers étudiés, le deuxième le % des dossiers financés, le troisième le % des investissements et le quatrième le % des emplois créés.

Graphique comparatif des prestations du projet ONUDI au compte du projet FED par antenne

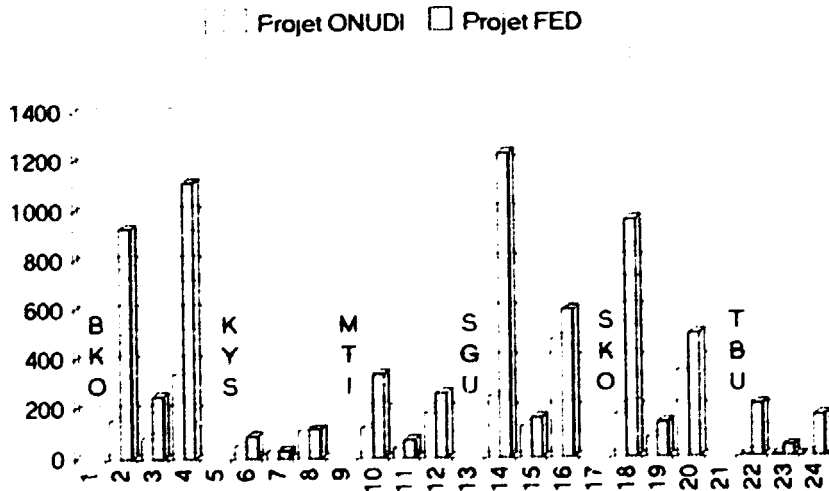

Dans les batonnets groupés par antenne la première comparaison est le nombre des dossiers étudiés, la deuxième le nombre des dossier financés, la troisième le nombre des emplois créés.

A N N E X E 3

Comparaison des résultats

attendus et réalisés

SOMMAIRE DES RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS

Contrats et avenants	Objectifs	Résultats attendus	Résultats obtenus	Écart	Remarques
Contrat de base et					
Avenant 1	Nbr Dossiers étudiés	50	243	193	
11 02 88 - 31 05 90	Nbr Projets réalisés	20	119	99	
	Nbr Emplois créés	Pas spécifié	429	429	
	Nbr Projets suivis	20	119	99	
	Investissements réalisés CFA	Pas spécifié	688 426 530	688 426 530	
	Formation technologues	2	2	0	
Avenant 2					
01 06 1990 - 20 02 91	Nbr Dossiers étudiés	50	155	105	
	Nbr Projets réalisés	20	57	37	
	Nbr Emplois créés	Pas spécifié	197	197	
	Nbr Projets suivis	20	57	37	
	Investissements réalisés CFA	Pas spécifié	466 172 810	466 172 810	
Avenant 3					
21 02 91 - 31 05 91	Nbr Dossiers étudiés	Pas spécifié	70	70	
	Nbr Projets réalisés	Pas spécifié	13	13	
	Nbr Emplois créés	Pas spécifié	60	60	
	Nbr Projets suivis	Pas spécifié	13	13	
	Investissements réalisés CFA	Pas spécifié	86 923 666	86 923 666	
	Formation technologues	2	2	0	
Avenant 4					
01 08 91 - 29 02 92	Nbr Dossiers étudiés	60	149	89	
	Nbr Projets réalisés	30	95	65	
	Nbr Emplois créés	100	476	376	
	Nbr Projets suivis	30	95	65	
	Investissements réalisés CFA	Pas spécifié	1 035 095 052	1 035 095 052	
Contrat 2					
01 03 92 - 30 06 92	Nbr Dossiers étudiés	80	115	35	
	Nbr Projets réalisés	40	31	-9	Manque crédit
	Nbr Emplois créés	100	180	80	
	Nbr Projets suivis	40	101	61	
	Investissements réalisés CFA	Pas spécifié	254 377 663	254 377 663	
Contrat 2 avenant 1					
20 08 92 - 31 01 93	Nbr Dossiers étudiés	70	100	30	
Note	Nbr Projets réalisés	30	61	31	
les résultat donnés sont	Nbr Emplois créés	100	196	96	
à la date de 31 12 92	Nbr Projets suivis	30	50	20	
dont 1 mois avant la fin	Investissements réalisés CFA	20 000 000	732 209 073	712 209 073	
du contrat					
Totaux					
	Nbr Dossiers étudiés	310	832	522	
	Nbr Projets réalisés	140	376	236	
	Nbr Emplois créés	300	1 538	1 238	
	Nbr Projets suivis	140	333	193	
	Investissements réalisés CFA	20 000 000	3 263 204 794	3 243 204 794	
	Formation technologues	4	4	0	

A N N E X E 4

**Liste des projets ayant bénéficié
d'une assistance technologique par antenne**

Projet DP/MLI/85/011 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
Assistance au projet PNUD/BIT								
BKO-	Agence de voyage	Service	Bamako	2a5	7 500 000	Survi	3	Demarrage
BKO-	Alimentation	Commerce	Bamako	2a5	Pas financé	Etude		
BKO-	Atelier de peinture réparat' pare brise	Ind embc	Bamako	2a5	Pas financé	Etude.devis		
BKO-	Atelier mécanique tondée	Ind embc	Bamako	2a4	Pas financé	Etude évaluation marché		
BKO-	Auberge	Service	Bamako	1a8	Pas financé	Etude.info.proforma		
BKO-	Avculture	Prod an	Bamako	2a4 1a5	Pas financé	Etude.info.proforma		
BKO-	Bananière	Prod veg	Marabougo	1a5	Pas financé	Etude		
BKO-	Bloc maigre	Ind embc	Bamako	2a6	Pas financé	Etude.info évaluation coût		
BKO-	Boulangerie	Ind ali	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Brodere couture	Ind tex	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Bureautique	Service	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Cabinet dentaire	Ens & Santé	Bamako	2a6	17 550 000	Etude.Survi	3	Demarrage
BKO-	Cabinet médicale	Ens Santé	Bamako	2a6		Survi investissement	2	
BKO-	Conservé	Ind ali	Bamako	2a5	Pas financé	Etude		
BKO-	Conservé de tomate	Ind ali	Bamako	2a4	Pas financé	Etude.info		
BKO-	Decoraton	Ind embc	Bamako	2a4	Pas financé	Etude.info		
BKO-	Decoréage commerce de riz	Ind ali	Kolongo	2a5	Pas financé	Etude		
BKO-	Electro-mecanique	Ind embc	Bamako	2a4.1a5.2a6	Pas financé	Etude.info		
BKO-	Fabrique de bnques	Ind embc	Tienfala	2a5.1a6.2a6	Pas financé	Etude.info proforma		
BKO-	Fabrique de glace et comel	Ind ali	Bamako	2a5	9 500 000	Survi	4	Aménagement commande
BKO-	Gymnase	Service	Bamako	1a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Iceberg snack	Ind ali	Bamako	2a6	Pas financé	Etude.évaluation		
BKO-	Imprimerie	Ind embc	Bamako	2a4	Pas financé	Etude.proforma		
BKO-	Informatique	Service	Bamako	2a4.1a5	Pas financé	Etude.promoteur incapable gérer		
BKO-	Jus de fruits	Ind ali	Bamako	2a4	Pas financé	Etude.info		
BKO-	Menuiserie metalique	Ind embc	Bamako	2a5 1a6	Pas financé	Etude		Evaluation equipement
BKO-	Pâte alimentaire	Ind ali	Bamako	1a4	Pas financé	Info proforma		
BKO-	Pâte d'arachide	Ind ali	Bamako	1a6	Pas financé	Etude.info.proforma		
BKO-	Peaux et cuirs	Ind embc	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Pressing	Service	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		

Projet DP/ML/85/011 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
BKO-	Pressing	Service	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Prestation agricole	Ind embc	Kita	1a4.2a6	Pas financé	Etude complément info		
BKO-	Production chimique	Ind embc	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Production laitière	Prod ar.	Tienfala	1a6	Pas financé	Etude.prolorma		
BKO-	Produit Cosmétique	Ind embc	Bamako	2a4	Pas financé	Etude prolorma		
BKO-	Rizene	Ind ali	Kolongo	1a4.2a4	Pas financé	Etude. complément info		
BKO-	Sechoir solaire	Ind ali	Bamako	1a6	Pas financé	Etude. prolorma.information		
BKO-	Taxi Express	Service	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Teinture	Ind tex	Bamako	1a6.2a6	Pas financé	Etude.info.enquête technique		
BKO-	Telecentre	Service	Bamako	1a6	Pas financé	Etude.info.prolorma		
BKO-	Tracteur	Ind embc	Dougouto	2a4	Pas financé	Etude information		
BKO-	Travaux publics	Ind embc	Bamako	2a5	13 400 000	Suivi	12	
BKO-	Tuile fibromortier	Ind embc	Bamako	2a4	Financement canada	demande pour formation		
BKO-	Vente de poisson frais	Ind ali	Bamako	2a5	Pas financé	Etude.information prolorma		
BKO-	Vente cereales	Service	Bamako	1a5.2a5	780.000	Suivi	2	Installation
BKO-073	Menuiserie bois	Ind embc	Bamako	1a5.2a5.1a6	1 200 000	Suivi	2	Marche à la limite
BKO-089	Trombones - Agrales	Ind embc	Bamako	2a4.1a5.1a6.2a6	Pas financé	Etude.tax complément info		
BKO-142	Electro froid 142 S100	Ind embc	Bamako	2a4.1a5.2a6	Pas financé	Etude marché construction. équipement		
BKO-156	Pointes-Vis-Boulons 156 P200	Ind embc	Bamako	1a4.2a4.1a5	Pas financé	Etude. tax complément info		
BKO-186	Laiterie 186 P100	Ind ali	Bamako	2a4.1a5.2a5	29 000 000	Etude.info.Suivi	12	Accord banque commande
BKO-204	Boulangerie	Ind ali	Bamako	1a4.2a4.1a6	30 000 000	Etude. prolorma équipement. Suivi	8	Accord de la banque
BKO-214	Decorticage 214P100	Ind ali	Baguineda	2a4.1a5.2a6	1 350 000	Suivi	2	Allente campagne
BKO-214	Atelier d'usinage 214 P200	Ind embc	Bamako	2a4.1a5	Pas financé	Etude. info.prolorma		
BKO-245	Pressing 245P300	Service	Bamako	2a4.1a5.2a5	Pas financé	Etude. prolorma. info		
BKO-302	Couture & broderie 302P200	Ind tex	Bamako	1a5.1a6.2a6	4.500.000	Etude.prolorma. Suivi	5	Commande
BKO-325	Entreprises agricoles	Ind embc	Baguineda	1a6.2a6	Pas financé	Etude		
BKO-327	Lavage auto	Ind embc	Bamako	1a6	Pas financé	Etude.info		
BKO-343	Menuiserie	Ind embc	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-343	Menuiserie moderne	Ind embc	Bamako	1a6	Pas financé	Etude.évaluation		
BKO-364	Sengraphie	Ind embc	Bamako	1a6.2a6	Pas financé	Etude		
BKO-365	Lavage auto	Ind embc	Bamako	1a6	Pas financé	Etude.info		

Projet DP/MLI/85/011 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
BKO-400	Confection vêtement	Ind tex	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-409	Atelier couture	Ind tex	Bamako	2a6	Pas financé	Etude.info.proforma		
BKO-410	Forge moderne	Ind.embc	Bamako	1a6.2a6	Pas financé	Etude.evaluation equipement		
BKO-411	Pierre à lecher	Ind ali	Bamako	1a5.2a5.2a6	Pas financé	Etude.info.proforma		
BKO-426	Riziculture	Prod.veg	Kirina	1a6.2a6	Pas financé	Etude.evaluation		
BKO-428	Tabaculture	Prod.veg	Selingué	1a6.2a6	Pas financé	Etude.info		
BKO-431	Cabinet dentaire	Ens Santé	Bamako	2a6	Pas financé	Etude.info		
BKO-437	Cosmos pressing	Ind.tex	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-440	Teinture	Ind.tex	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-444	Pressing	Ind.tex	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
KYS-	Boulangerie industrielle	Ind.ali	Kayes	1a4	29 000 000	Suivi	8	Commande équipement
MTI-	Bar - restaurant	Ind.ali	Téné	1a6	Pas financé	Etude.achat equipement		
SGU-	Rizène	Ind.ali	Kolongo	2a4.2a5.1a6	Pas financé	Etude		
SGU-	Savon artisanal	ind.embc	Segou	1a6.2a6	Pas financé	Etude.evaluation		
SGU-141	Menusene	Ind.embc	Ségou	2a5	Pas financé	Etude		
Projet ONUDI	Total des dossiers étudiés=	76	Total des investissements :	143.760.000	Total des emplois créés =	63	Projets réalisés =	11

PROJET B.I.T.

300

344.687.000

167

90

Rapport ONUDI/B.I.T.

0,25

0,42

0,38

0,12

Rapport : projets réalisés/dossiers ouvert:

ONUDI = 0,14

B.I.T. = 0,30

4.1 Antenne de Bamako

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
Assistance au projet FED, antenne de Bamako								
BKO-	Atelier de chromage	Ind.embc	Bamako	2a2	Pas financé	Recherche		
BKO-	Bananaerie	Prod.veg	Kalabana	1a5	Pas financé	Etude		
BKO-	Boulangerie	Ind.ali	Kangaba	2a4,1a6,2a6	Pas financé	Etude information		
BKO-	Chateau d'eau	Ind.embc	Bamako	3a1	Pas financé	Etude	-	Semble pas rentable
BKO-	Confiserie	Ind.ali	Bamako	2a5	Pas financé	Etude, information		
BKO-	Decortiqueuse commerce Riz	Ind.ali	Sélingué	1a6,2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Elevage de grenouilles	Prod.ani	Selenge	3a1	Pas financé	Etude		Pas fiable
BKO-	Entrepôt frigorifique	Ind.embc	Bamako	1a1	Pas financé	Etude		
BKO-	Entreprise agricole	Ind.embc	Baguinéda	1a5	Pas financé	Etude		
BKO-	Extraction d'or	Ind.embc	Keniéba	a3	Pas financé	Etude		
BKO-	Fabrication mayonnaise	Ind.ali	Bamako	2a2	Pas financé	Etude, recherche		
BKO-	Fabrication pots de echappement	Ind.embc	Bamako	2a2	Pas financé	Etude, recherche		
BKO-	Fabrique aliment bétail	Ind.ali	Bamako	2a5	Pas financé	Etude,information		
BKO-	Fabrique de colle	Ind.embc	Bamako	2a5	Pas financé	Etude,information		
BKO-	Fabrique yaourts	Ind.ali	Bamako	3	Pas financé	Facture		Pas fiable
BKO-	Importation matériel de table	Service	Bamako	2a2	Pas financé	Recherche		
BKO-	Institut formation electriciens	Ens.Santé	Bamako	1	Pas financé	Etude dossier		
BKO-	Jus de fruits	Ind.ali	Bamako	1a6	Pas financé	Etude		Etude, information
BKO-	Laiterie	Ind.ali	Bamako	2a5	Pas financé	Etude, information		
BKO-	Mécanique generale	Ind.embc	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-	Menuiserie bois	Ind.embc	Bamako	2a4,1a5	Pas financé	Etude, proforma		
BKO-	Menuiserie metalique	Ind.embc	San	1	Pas financé	Etude de dossier		
BKO-	Publicité	Service	Bamako	2a4	Pas financé	Etude, recherche info		
BKO-	Reportage video	Service	Bamako	2a2	Pas financé	Etude, recherche		
BKO-	Riziculture decortilage commerce	Ind.ali	Selingue	1a4	Pas financé	Etude évaluation, besoin en machin		
BKO-	Transport	Ind.embc	Bamako	a3	Pas financé	Etude		
BKO-	Transport benne	Ind.embc	Bamako	a3,1a4	Pas financé	Etude		
BKO-	Transport inter-urban	Ind.embc	Bamako	2a4	Pas financé	Etude devis, réparation		
BKO-	Transport urbain	Ind.embc	Bamako	a3	Pas financé	Etude		
BKO-	Transport urbain	Ind.embc	Bamako	a3	Pas financé	Etude		
BKO-0001	Vulcanisation	Ind.embc	Bamako	a3,1a4,2a4,1a5,1a6	2.000.000	Suivi	3	Marche
BKO-0002	Fonderie	Ind.embc	Bamako	4,5,6,7,(1)a1,1a4,2a4	15.082.000	Suivi	10	Considéré en liquidation, arrêté
BKO-0004	Moulin	Ind.ali	Bamako	1a4, 2a4	1.350.000	Suivi	1	Marche
BKO-0005	Moulin	Ind.ali	Selingue	a3,1a4,2a4,1a5	1.150.000	Suivi	1	Marche
BKO-0010	Bananaerie	Prod.veg	Samanko	1a6	4.852.615	Suivi	4	Marche bien

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
BKO-0012	Menuiserie	Ind embc	Bamako	3	8.150.000	Facture, suivi	7	Contentieux, mauvais promoteur
* BKO-0016	Bananaeraie	Prod.veg	Bamako	5	2.640.000	Suivi	2	Marche
* BKO-0027	Elevage de porc	Prod.ani	Bamako	A2,A3	1.835.000	Suivi	2	En liquidation
BKO-0044	Ecole informatique	Ens.santé	Bamako	2a2	? 202.000	Recherche,Suivi	6	Faillite, problème de marché
* BKO-0114	Atelier de couture broderie	Ind. tex	Bamako	7,(1)a1,1a4	5.300.000	Evaluation matériel,Suivi	3	Faillite, mauvais promoteur
BKO-0161	Fabrique de néon	Ind embc	Bamako	1a4	5.000.000	Suivi	5	A revoir à l'étude, faillite
BKO-0176	Atelier de réparation de pneus	Ind embc	Bamako	6,7,1a4	2.082.000	Suivi	3	Marche
BKO-0176	Vulcanisation	Ind embc	Bamako	1a4,2a4,2a5	2.355.000	Suivi	4	Marche à la limite
BKO-0216	Transport	Ind embc	Bamako	6	20.000.000	Evaluation matériel	2	Marche
BKO-0263b	Transport	Ind embc	Bamako	6	6.562.000	Suivi		Arrêté
BKO-0275	Maraichage et bananaeraie	Prod.veg	Fala	a3,2a4	2.900.000	Suivi,motopompe en panne	2	Marche
BKO-0285	Bananaeraie & maraichage	Prod.veg	Sabaliboug	2a4,1a5	2.721.000	Suivi	3	Achal 2em moto-pompe marche
BKO-0309	Bananaeraie	Prod.veg	Tiefala	2a4	2.720.000	Suivi	3	Suivi problème motopompe
BKO-0321	Maraichage	Prod.veg	Fala	2a4	2.926.000	Suivi		Arrêté
* BKO-0326	Miellerie	Ind ali	Bamako	a1,1a2,1a4,1a6,2a6	5.361.000	Factures, conseils, suivi	4	Marche bien
BKO-0333	Bananaeraie	Prod.veg	Bamako	1a4	Pas financé	Etude		
BKO-0390	Alimentation	Commerce	Bamako	6,7,(1)a1	5.081.033	Factures		Marche
* BKO-0401	Commerce détail	Prod.ani	Bamako	A2,A3	2.111.000	Suivi	1	Marche pas
* BKO-0406	Aviculture	Prod.ani	Bamako	A3	2.302.000	Suivi	2	Marche
* BKO-0407	Aviculture	Prod.ani	Bamako	A3	2.302.000	Suivi	2	Marche
BKO-0446	Fabrique articles en cuir	Ind embc	Bamako	a3,1a4	Pas financé	Etude		Risque
BKO-0447	Atelier couture	Ind. tex	Bamako	5	15.328.000	Evaluation	8	Faillite problème de marché
* BKO-0478	Reparation de pneus	Ind embc	Bamako	1a1	800.000	Suivi	2	Marche
BKO-0503	Fabrication de grillage	Ind embc	Bamako	6,7,(1)a1	1.367.955	Suivi	5	Remboursé
BKO-0507	Aviculture	Prod.ani	Bamako	A3	5.289.000	Suivi	2	Marche bien
* BKO-0529	Aviculture	Prod.ani	Bamako	A3, A5	1.587.000	Suivi	2	Marche
BKO-0530	Station essence	Ind embc	Bamako	3a1	Pas financé	Etude		
BKO-0531	Décoration, imprimerie à chaud	Ind embc	Bamako	5	Pas financé	Etude		
BKO-0538	Pizzeria	Service	Bamako	1a5,1a6,2a3	8.580.000	Suivi		Liquidation
BKO-0539	Exploitation d'un compresseur	Ind embc	Bamako	5,1a2,a3	12.733.000	Etude,factures, suivi, à revoir	3	En liquidation, problème marché
BKO-0550	Travail	Ind embc	Bamako	1a2	Pas financé	Etude, evaluation		
BKO-0559	Travail urbain	Ind embc	Bamako	2a2	3.327.000	Etude, evaluation	1	
BKO-0571	Station essence	Ind embc	Kangaba	1a4	11.800.000	Suivi	5	Marche
BKO-0575	Reparation des balances	Ind embc	Bamako	a3	2.750.000	Suivi	5	Problème marché faillite
BKO-0588	Fabrique de glace	Ind ali	Bamako	2a1	Pas financé	Etude		
BKO-0590	Aviculture	Prod.ani	Bamako	2a2, A5	4.537.752	Suivi		Arrêté

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
BKO-0610	Station essence	Ind.embc	Bamako	1a4.2a4.1a5.2a5	5.630.000	Suivi	4	Achal groupe électrogène.marche
* BKO-0619	Magasin pièces détachées d'occasion	Ind.embc	Bamako	1a1	10.210.000	Estimation valeur stock	4	Faillite. mauvais étude marché
BKO-0636	Espace culturel	Service	Bamako	1a5	39.083.643	Suivi		Installation
BKO-0643	Fabrication trombones	Ind.embc	Bamako	7	Pas financé	Etude		Pas de marché
BKO-0655	Aviculture	Prod.ani	Bamako	A5	1.444.000	Suivi	3	Marche
BKO-0657	Aviculture	Prod.ani	Bamako	A3. A5	870.000	Suivi	2	Marche
BKO-0661	Embouche Industrielle	Prod.ani	Bamako	A3	6.977.000	Suivi	4	
BKO-0668	Pâtisserie	Ind.ali	Bamako	1a1.1a2	Pas financé	Etude. information. factures		Pas marché
BKO-0678	Menuiserie métallique	Ind.embc	Bamako	1a4	Pas financé	Etude		A reformuler
BKO-0688	Garage moderne	Ind.embc	Bamako	6.7.(1)a1.1a5	Pas financé	Etude. conseils		
BKO-0690	Impriméne	Ind.embc	Bamako	1a4	Pas financé	Etude.information facture		
BKO-0691	Mali hydrocarbure	Ind.embc	Bamako	2a4.1a6	17.548.000	Suivi	10	Marche
BKO-0693	Culture de cornichons	Prod. veg	Selingué	2a2	28.570.664	Recherche,Suivi		Faillite.mauvaise etude dossier
* BKO-0705	Atelier de décoration	Ind.embc	Bamako	6	Pas financé	Etude		
BKO-0721	Savonnerie artisanale	Ind.embc	Bamako	a3	1.009.000	Suivi	3	Problème marché.failite
BKO-0731	Traitement du gingembre	Ind.ali	Bamako	2a2	Pas financé	Etude. recherche		
BKO-0734	Cinéma	Ind.embc	Dioula	2a1	Pas financé	Etude		
BKO-0756	Maraichage et bananeraie	Prod. veg	Fala	a3.2a4	2.600.000	Suivi	2	Marche
BKO-0759	Atelier maintenance	Ind.embc	Bamako	1a1	Pas financé	Etude		
BKO-0760	Bar restaurant	Ind.ali	Bamko	1a2	2.637.000	Suivi	4	Faillite. mauvais étude marche
BKO-0761	Station essence	Ind.embc	Kali	1a4.2a4.1a5.2a5	41.880.000	Suivi	7	Demarrage.marche très bien
BKO-0770	Fumage de poisson	Ind.ali	Bamako	1a1	Pas financé	Etude		Marche à la limite
BKO-0783	Vial Mali	Ind.embc	Bamako	2a4.1a5.2a5.1a6.2a6	20.650.000	Suivi. commande formation	12	Amenagemt.installat.formation
BKO-0784	Fabrication de fusils	Ind.embc	Bamako	7.(1)a1	En cours	Etude. factures		
BKO-0787	Embouche Industrielle	Prod.ani	Bamako	A2	5.315.000	Etude. suivi	4	Marche bien
* BKO-0792	Orpillage	Ind.embc	Kenieba	2a2. a3	9.350.000	Suivi. à revoir	5	Problème d'équipement.failite
BKO-0808	Epicerie	Commerce	Bamako	1a6	16.270.000	Amenagement achat équipement		
BKO-0831	Boulangerie	Ind.ali	Bamako	3a1.1a2	Pas financé	Evaluation matériel.facture proforma		
BKO-0834	Station essence	Ind.embc	Bamako	2a4.2a5	10.200.000	Suivi	5	Aménagement.demarrage
BKO-0839	Tricotage couture brodée	Ind.tex	Bamako	2a2.1a4	11.170.000	Suivi	9	Marche
* BKO-0864	Vulcanisation	Ind.embc	Bamako	1a2	1.177.325	Suivi	1	Faillite
BKO-0875	Couture broderie	Ind.tex	Bamako	a3	11.400.000	Suivi	13	Marche très bien
BKO-0881	Bijouterie	Ind.embc	Bamako	a3	9.600.000	Suivi	4	Faillite. mauvaise étude marche
BKO-0887	Embouche	Prod.ani	Bamako	2a2	5.852.208	Suivi		Marche
BKO-0888	Atelier d'alesage	Ind.embc	Bamako	1a4.2a4.2a5.1a6.2a6	4.605.636	Suivi	2	Difficulté de marché et outils
BKO-0896	Bananeraie	Prod.veg	Tiéfala	2a4	2.900.000	Suivi	3	Marche

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
BKO-0997	Transport urbain	Ind embc	Bamako	a3.1a4	7.500.000	Suivi	2	Démarrage.marche
BKO-0999	Transport de sable	Ind embc	Bamako	2a2.3a2.2a4.1a5	8.700.000	Suivi.refinancement	2	Arrêté.justice.liquidé
BKO-0903	Maraichage et bananeraie	Prod veg	Samanko	a3.1a4.2a4.1a5.2a5	2.900.000	Suivi.aménagement	4	Installation.démarrage.marche
BKO-0906	Pressing	Ind tex	Bamako	1a6	Pas financé	Etude		Evaluation atelier
BKO-0907	Couture teinture	Ind tex	Bamako	1a4.2a4	10.300.000	problème apport personnel	7	Aménagement.demarrage
BKO-0912	Boulangerie	Ind ali	Bamako	1a4	Pas financé	Etude.évaluation.équipement		
BKO-0927	Pharmacie	Ens santé	Bamako	a3	14.000.000	Suivi	4	Marche très bien
BKO-0929	Couture brodée	Ind tex	Bamako	a3.1a4	7.531.000	Suivi	6	Marche
BKO-0930	Boulangerie	Ind ali	Bamako	2a2	Pas financé	Evaluation matériel		
BKO-0939	Couture	Ind tex	Bamako	1a4	11.170.000	Suivi	9	Démarrage.marche très bien
BKO-0941	Pharmacie	Ens santé	Bamako	1a4	3.900.000	suivi	3	Démarrage
BKO-0945	Transport (marchandise)	Ind embc	Bamako	2a2.a3.1a4.1a6	4.660.000	Etude.recherche.Suivi	2	Démarrage
BKO-0948	Transport	Ind embc	Bamako	a3	Pas financé	Etude		
BKO-0966	Construction Mécanique	Ind embc	Bamako	1a4.2a4.1a5.1a6.2a6	3.459.593	Suivi.reparation.instal	4	Marche
BKO-0963	Sculpture	Ind embc	Bamako	2a5	789.000	Suivi	4	Problème de marché
BKO-0967	Couture Brodée	Service	Bamako	1a4	9.176.693	Suivi	4	Marche très bien
BKO-0976	Boulangerie	Ind ali	Kita	3a2.a3.1a4	29.888.000	Evaluation matériel.Suivi	10	Failite.mauvaise étude marche
BKO-0990	Transport cereales	Ind embc	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-1018	Couture & brodée	Ind tex	Bamako	1a4.2a4.1a5.2a5.1a6	8.147.000	Demarrage.Suivi	6	Marche très bien
BKO-1041	Bouchère	Ind ali	Bamako	1a4	3.550.000	suivi	5	Démarrage.marche
BKO-1044	Fabrique de trombones et épingles	Ind embc	Bamako	a3	Pas financé	Etude		Problème apport personnel
BKO-1046	Maraichage et bananeraie	Prod veg	Bamako	1a4.2a4	4.452.000	Suivi	4	Achat équipement
BKO-1047	Boulangerie	Ind ali	Bamako	a3	Pas financé	Etude		
BKO-1065	Fabrique de matériels agricoles	Ind embc	Bamako	a3	Pas financé	Etude		
BKO-1070	Couture broderie	Ind tex	Bamako	1a4.2a4.1a5.2a5.1a6	13.282.000	Suivi.aménagement installé*	15	Marche très bien
BKO-1078	Bar-restaurant	Ind ali	Bamako	1a6	2.218.289	Suivi		Installation
BKO-1093	Birta - informatique	Service	Bamako	1a6	44.500.058	Suivi	10	Démarrage
BKO-1096	Hôtel	Service	Bamako	1a6.2a6	72.000.000	Investissement en cours. suivi		
BKO-1112	Transport benne	Ind embc	Bamako	1a4	Pas financé	Etude		
BKO-1118	Cabinet dentaire	Ens Santé	Bamako	1a5.2a5.2a6	25.000.000	Suivi		Installation commande équip
BKO-1136	Auberge du sahel	Ind ali	Bamako	2a4.1a5.2a5.1a6	19.000.000	Amenagement.installation.reparat	13	Achat équipement.Marche
BKO-1141	UCEMA	Ind embc	Bamako	2a4.1a5.2a5.1a6.2a6	37.596.000	Suivi		Redémarrage progressif
BKO-1146	Minoterie	Ind ali	Bamako	1a5	Pas financé	Etude proforma		
BKO-1149	Télé action progrès	Service	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-1150	Salon de couture	Service	Bamako	1a6	9.300.200	Suivi		Installation commande
BKO-1160	Production glace sorbets	Ind ali	Bamako	1a5.2a5	Pas financé	Etude.proforma.marché		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
BKO-1164	Atelier peinture répar* pare brise	Ind.embc	Bamako	1a5	Pas financé	Etude devis aménagement atelier		
BKO-1168	Tabaculture	Prod. veg	Sélingué	1a5	15.700.000	Suivi	28	Achat équipement.démarrage
BKO-1169	Transport	Ind.embc	Bamako	1a5	Pas financé	Etude		
BKO-1173	Ménuiserie	Ind.embc	Bamako	1a6,2a6	Pas financé	Etude		
BKO-1175	Fabrique de briques	Ind.embc	Bamako	2a6	Pas financé	Etude		
BKO-1177	Riko glasse	Ind.ali	Bamako	1a6,2a6	Pas financé	Etude		
* BKO-A	Production laitière	Prod.ani	Bamako	A2	Pas financé	Etude		Pas rentable
* BKO-A	Embouche Industrielle	Prod.ani	Bamako	A2	Pas financé	Evaluation activité, promoteur		
* BKO-A	Embouche Industrielle	Prod.ani	Bamako	A2	Pas financé	Evaluation promoteur		
BKO-A	Maraichage	Prod. veg	Bamako	A2	Pas financé	Evaluation activité		
BKO-A	Commerce de bétail	Prod.ani	Bamako	A2	Pas financé	Etude		
BKO-A	Elevage de porcs	Prod.ani	Bamako	A2	Pas financé	Etude		Pas rentable
Projet ONUDI	Total des dossiers étudiés= 155		Total des investissements = 813.733.662			Total des emplois créés = 344		Projets réalisés = 84

PROJET FED	931	1.836.557.491	1115	253
Rapport ONUDI/FED	0,17	0,44	0,31	0,33
Rapport : projets réalisés/dossiers ouvert:	ONUDI = 0,54	FED = 0,27		

4.2 Antenne de Ségou

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
Assistance au projet FED, antenne de Ségou								
SGU-	Bar-restaurant	Ind. ali	Markala	2a2	Pas financé	Etude		
SGU-	Buvette ambulante	Commerce	Ségou	3a2	Pas financé	Evaluation matériel		
SGU-	Compostage	Ind. embc	Niono	2,3,4,5	Pas financé	Etude, factures		Arrêté, recherche promoteur
SGU-	Ferme	Prod. veg	Molodo	A4,A5	Pas financé	Etude		
SGU-	Production fourrage	Prod. veg	Ke-Macina	A4,A5	Pas financé	Etude		
SGU-	Profils a froid	Ind. embc	Ségou	4	Pas financé	Etude, information		
SGU-	Transport	Ind. embc	Ségou	2a6	Pas financé	Etude		
SGU-	Transport trét	Ind. embc	Ségou	1a4	Pas financé	Etude		
SGU-	Vente de pièces	Ind. embc	Ségou	1a4	Pas financé	Etude		
SGU-0002	Distribution menuiserie	Ind. embc	Ségou	2,3,4, (3)a1	11.783.235	Etude, suivi	24	Failite
SGU-0003	Distribution alimentaire	Commerce	Ségou	2	30.612.495	Etude, suivi aménagement	5	Mauvaise gestion
SGU-0005	Embouche	Prod. ani	Ségou	1	8.533.000	Etude aprovement eau Suvu	4	Failite, en liquidation
SGU-0010	Briquetterie	Ind. embc	Ségou	2,3,4,5	Pas financé	Information, étude		Pas encore financé
SGU-0019	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A4	638.000	Etude, évaluation promoteur	2	Remboursé
SGU-0019b	Agro Pastoral	Prod. ani	Ségou	1a4	2.900.000	Suivi	3	Marche
SGU-0022	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A1	Pas financé	Etude		
SGU-0037	Vulcanisation	Ind. embc	Ségou	1a6,2a6	5.800.000	Suivi	3	Marche à la limite
SGU-0039	Bananaerie	Prod. veg	Fasongo	A3	6.988.000	Suivi	3	Remboursé
SGU-0046	Rechapage des pneus	Ind. embc	Ségou	1a4,2a4,1a5,2a5,1a6	36.963.315	Suivi, redémarrage	12	Arrêté
SGU-0047	Boulangerie	Ind. ali	Markala	2a2	Pas financé	Etude, évaluation matériel		
SGU-0050	Pisciculture	Prod. ani	Niono	A1,A2,A3	7.052.000	Suivi	4	
SGU-0050b	Pisciculture	Prod. ani	Niono	A3, A4, A5,A6	Pas financé	Etude		
SGU-0051	Menuiserie	Ind. embc	Ségou	1	Pas financé	Etude, évaluation entrepreneur		Manque attitude professionnel
SGU-0063	Four a chaux	Ind. embc	Katiéna	5	Pas financé	Etude, évaluation		Pas fiable
SGU-0075	Transport fluvial	Ind. embc	Ségou	3	Pas financé	Etude		
SGU-0077	Bananaerie	Prod. veg	Ségou	A3, A4, A5,A3	4.112.410	Suivi	3	Marche
* SGU-0093	Aviculture	Prod. ani	Ségou	A1,A2,A3, A4, A5	1.541.134	Suivi	2	En liquidation
* SGU-0096	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude		
* SGU-0096	Aviculture	Prod. ani	Ségou	A1,A2,A3	1.815.000	Etude, suivi	2	Remboursé
SGU-0103	Ferme-agricole	Prod. veg	Marabougou	A4, A5,1a5,1a6,2a6	11.930.850	Etude, suivi	4	Projet en difficulté
SGU-0107	Production laitière	Prod. ani	Ségou	A1,A2	3.050.000	Suivi	0	En liquidation
* SGU-0111b	Aviculture	Prod. ani	Pelegana	A5,A6,2a4,1a6,2a6	25.310.960	Etude, expertise, suivi	5	Extention, marche, proforma broy
SGU-0116	Garage	Ind. embc	Ségou	1a4	3.780.000	Suivi	8	
SGU-0117	Aviculture	Prod. ani	Ségou	A1,A2,A3, A4,A5	16.212.924	Etude, suivi	4	Marche bien

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SGU-0122	Extraction sable et gravier	Ind. embc	Ségou	1.2a6	3.000.000	Etude, suivi construction	10	Marche à la limite
SGU-0122b	Transport sable, gravier	Ind. embc	Ségou	7.3a2.1a4.2a4.2a5	3.000.000	Etude, évaluation matériel, suivi	1	Ne marche pas, réhabilitation
SGU-0126	Décortiqueuse	Ind. ali	Niono	2a2	1.942.000	Suivi	3	
SGU-0152	Production laitière	Prod. ani	Ségou	A1	Pas financé	Etude		
SGU-0153	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A1, A2, A3	2.335.000	Etude, suivi	0	Remboursé
SGU-0153b	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A5	3.451.000	Etude, suivi	3	Marche bien
SGU-0166	Garage jeso	Ind. embc	Ségou	5.1a4.2a4	3.780.000	Etude méthodes, suivi	8	Marche très bien
SGU-0176b	Aviculture	Prod. ani	Ségou	A5	Pas financé	Etude		
SGU-0192	Moulin à grain	Ind. ali	Ségou	1.2.3.1a4	1.269.000	Installation, suivi	2	Remboursé
SGU-0262	Aviculture	Prod. ani	Ségou	A1, A2, A3, A4	1.971.890	Etude, suivi	3	Faillite
SGU-0283	Aviculture	Prod. ani	Ségou	A1, A2, A3	2.064.000	Suivi	0	En liquidation
SGU-0303	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A1, A2	4.438.000	Etude, suivi	0	En liquidation
SGU-0312	Maraichage	Prod. veg	Ségou	3A4	1.088.830	Suivi	2	
SGU-0322	Production laitière	Prod. ani	Ségou	A1, A2, A3	4.985.000	Suivi	0	En liquidation
SGU-0325	Bananaierie	Prod. veg	Ségou	A3	4.898.000	Suivi	3	Marche
SGU-0358	Moulin, minoterie, boulangerie	Ind. ali	Niono	4	Pas financé	Etude, énergie		Financé par autre service
SGU-0376	Prestations sces agricoles	Ind. embc	Kokry	2a5	6.991.850	Suivi	2	
SGU-0396	Embouche industrielle	Prod. ani	Niono	A1	Pas financé	Etude		
SGU-0403	Bar restaurant	Ind. ali	Ségou	1a4	2.870.740	Etude, Suivi	5	
SGU-0444	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude		
SGU-0508	Décortiqueuse	Ind. ali	Niono	7	3.915.000	Reprise, suivi	0	Faillite
SGU-0509	Prestation agricole	Ind. embc	Ségou	3a1.3a2	5.459.991	Suivi	2	Arrêté, réhabilité
SGU-0509b	Prestation agricole	Ind. embc	Ségou	3a1.2a2	1.380.000	Etude, suivi		
SGU-0514	Aviculture	Prod. ani	Ségou	A2, A3	4.301.080	Suivi	3	Echoué
SGU-0543	Nourriture bétail	Ind. ali	Ségou	1	Pas financé	Etude, information, factures		Dettes ailleurs
SGU-0544	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A1, A2, A3	26.590.000	Etude, suivi	9	Remboursé
SGU-0544b	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A2, A3, A5	34.275.000	Etude, suivi	8	Marche bien
SGU-0545	Mini-laiterie	Ind. ali	Ségou	3a2, a3, 1a4, 2a4, 1a5	30.862.500	Etude, factures, suivi	8	En liquidation
SGU-0545b	Emballage plastique	Ind. embc	Ségou	5.6.7	Pas financé	Etude, information, factures		En considération
SGU-0547	Maraichage	Prod. veg	Ségou	A6	980.000	Suivi	5	Marche
SGU-0560	Transport frêt	Ind. embc	Ségou	1a2.2a2 a3 2a4.1a5	6.049.550	Suivi	2	Marche à la limite, réhabilitation
SGU-0563	Transport	Ind. embc	Ségou	5	13.800.000	Evaluation	3	Marche très bien
SGU-0568	Maraichage	Prod. veg	Ségou	4	4.413.550	Etude, facture, installation	3	Arrêté
SGU-0571	Bananaierie	Prod. veg	Ségou	A3, A5, A6	6.479.000	Suivi	3	Echoué
SGU-0576b	Tapisserie	Ind. tex	Ségou	5.3a1 1a2.3a2	5.837.988	Etude, méthodes, installation, suivi	8	Marche très bien

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SGU-0583	Couture	Ind tex	Ségou	4	535.000	Etude, factures, achat	3	Failite, mauvaise gestion
SGU-0584	Bananeraie	Prod veg	Konodimini	2a4, 1a5, 2a5, 1a6, 2a6	19 625.573	Suivi	5	Marche, achat 2ème pompe
SGU-0587	Fabrication briquettes combustibles	Ind embc	Ségou	6,7	Pas financé	Etude, information, factures		Pas fiable
SGU-0588	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A1, A2	1 953.500	Etude, suivi	3	Remboursé
SGU-0597	Boucherie	Ind ali	Ségou	A1	Pas financé	Etude		
SGU-0604	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A1	Pas financé	Etude		
SGU-0611	Bac	Ind embc	Ségou	3,5	Pas financé	Etude		Pas financé
SGU-0613	Transport	Ind embc	Ségou	3a1	Pas financé	Etude, expertise		
SGU-0618	Verger	Prod veg	Ségou	A4, A5	3 971.890	Suivi	3	
SGU-0618b	Distribution	Commerce	Ségou	2a6	3 663 884	Suivi	3	Marche
* SGU-0621	Cinéma	Service	Ségou	7	3 000 000	Suivi		Pas faisable
* SGU-0626	Prestations agricoles (Tracteur)	Ind embc	Dioro	1a1, 2a5	13 894 255	Suivi	3	
SGU-0626b	Prestations agricoles (balleuse)	Ind embc	Dioro	1a2, 2a2, 3a2	5 000 000	Etude, expertise du matériel, suivi	3	
SGU-0639	Decorticage	Ind ali	Dogon	4, 3a2, 2a4	3 428 830	Etude, factures, installation, suivi	3	Arrêté, redemare, marche
SGU-0657	Tabaculture	Prod veg	Ségou	1a2, 2a2, 2a4, 1a5	7 300 900	Suivi	3	Motopompe réparée
SGU-0665	Cinéma ambulant	Service	Ségou	1a1, 2a2	3 782 782	Etude, équipement, Suivi	3	
SGU-0673	Atelier de réparation frigorifique	Ind embc	Ségou	4	Pas financé	Etude	3	
SGU-0675	Bananeraie-maraichage	Prod veg	Ké-macina	A3, A6, 3a2, 1a4	10 439 260	Suivi, évaluation moto pompe	10	Marche
SGU-0675b	Vente engrais	Commerce	Ségou	2a6	Pas financé	Etude		
SGU-0676	Transport frêt	Ind embc	Ségou	1a2, 1a4, 2a4, 1a5, 2a5	10 870 255	Suivi	2	Camion arrêté, rehabilitation
SGU-0676b	Quincaille	Ind embc	Niono	2a6	Pas financé	Etude, évaluation devis		
* SGU-0681	Cinéma ambulant	Service	Ségou	1a1, 1a2, 1a4, 2a4, 2a6	3 719 170	Etude, évaluation voiture, Suivi	3	Failite
* SGU-0683	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A1	5 668 000	Suivi	2	Echoué
SGU-0687	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A3	Pas financé	Etude		
SGU-0687b	Fabrication aliment bétail	Ind ali	Ségou	A3	Pas financé	Etude		
SGU-0689	Service agricole	Ind embc	Ségou	A1	7 170 000	Suivi	3	Marche
SGU-0704	Transport	Ind embc	Ségou	3a1, 1a2	4 415 000	Etude, évaluation camion, suivi	2	Echoué
SGU-0705	Laboratoire Photo	Ind embc	Ségou	a3, 1a4, 2a4, 1a6, 2a6	35 180 000	Suivi	7	réalisation marche tres bien
SGU-0707	Four à chaux	Ind embc	Sandola	4	Pas financé	Etude, information		Pas fiable
SGU-0715	Cinéma ambulant	Service	Ségou	2a2	2 444 960	Etude, évaluation voiture, suivi	2	Remboursés, marche
SGU-0735	Night-club	Service	Ségou	1a1, 2a4, 1a5, 2a5	28 000 000	Etude, besoin énergie, Suivi	16	En cours de réalisation suivi
* SGU-0737	Fumage de poisson	Ind ali	Dioro	1a2, 2a2, 3a2, a3, 1a4	10 378 923	Etude, évaluation apor personnel	4	Arrêté
SGU-0738	Fabrication de chaises	Ind embc	Ségou	1a4	Pas financé	Etude		Pas fiable
SGU-0749	Transport	Ind embc	Ségou	3a1	5 019 044	Etude, évaluation camion, suivi	2	
SGU-0750	Labo-photo	Ind embc	Ségou	5, 8, 1a2, 1a6	Pas financé	Etude, factures, Suivi	6	Marche

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SGU-0751	Hôtel	Service	Dioro	5	7.446.330	Etude énergie, installation, suivi	0	Faillite
SGU-0753	Pharmacie vétérinaire	Ens. santé	Ségou	A1	Pas financé	Etude		
SGU-0756	Extraction sable et gravier mécanisé	Ind. embc	Ségou	2a4,1a5,2a5,1a6,2a6	35.000.000	Suivi	11	Suivi travaux de construction
SGU-0760	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2,A3	2.927.000	Etude, suivi	3	Remboursé
SGU-0760b	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A5,A6	3.089.000	Etude, suivi	2	Marche
SGU-0769	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-0770	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
* SGU-0779	Bouchene	Ind. ali	Ségou	A1	Pas financé	Etude		
SGU-0780	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-0782	Pâlisene	Ind. ali	Ségou	3a1,1a2, 2a2,3a2	18.290.000	Information, étude, suivi	5	Marche
SGU-0785	Pharmacie vétérinaire	Ens. santé	Ségou	A1,A2,A3, A4,A6	3.915.000	Etude, suivi	3	Marche bien
SGU-0790	Prestation agricole	Ind. embc	Kalabugu	5	Pas financé	Evaluation		Pas fiable
SGU-0795	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude		
* SGU-0798	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude		
SGU-0800	Prestations services agricoles	Ind. embc	Ségou	a3	Pas financé	Etude		
SGU-0801	Pharmacie	Service	Ségou	2a6	1.905.000	Suivi	3	Marche à la limite
SGU-0803	Centre équestre	Service	Ségou	3a1,A3, A4, A5,A6	16.000.000	Suivi	6	Marché
SGU-0809	Imprimerie	Ind. embc	Ségou	3a2, a3,1a4,2a5,1a6	30.855.450	Suivi, commande, installation	9	Marche
* SGU-0813	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-0814	Prestation agricole	Ind. embc	Ségou	6,1a2,2a2	5.517.025	Etude, facture, suivi	0	
SGU-0818	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
* SGU-0822	Elevage de porcs	Prod. ani	Ségou	A6	Pas financé	Etude		
SGU-0825	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-0826	Prestation agricole	Ind. embc	Farako	3a1	Pas financé	Etude, évaluation		
SGU-0828	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-0835	Restaurant	Ind. ali	Niono	3a2	7.835.000	Installation groupe, suivi	6	Marche bien
SGU-0836	Menuiserie métallique	Ind. embc	Ségou	1a	Pas financé	Etude		Dettes ailleurs
SGU-0838	Embouche Industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
* SGU-0840	Fabrication de cahiers scolaire	Ind. embc	Ségou	6,7	Pas financé	Etude, information, factures		Coûts hors budget
SGU-0844	Decortiqueuse	Ind. ali	Dougaboug	3a2,2a4,1a5,1a6,2a6	1.958.500	Etude, facture, installation, suivi	2	moteur en panne
SGU-0846	Buvette moderne	Commerce	Bla	3a2,1a4	Pas financé	Evaluation apport en nature		
SGU-0848	Imprimerie	Ind. embc	Ségou	7	Pas financé	Etude, facture		Concurrence avec autre projet
SGU-0852	Photo et animation	Ind. embc	Mandjakui	a3,1a4	2.031.991	Suivi	2	
SGU-0853	Bar - Restaurant	Ind. ali	Niono	2a2,1a4,2a4,1a6,2a6	8.483.000	Etude, évaluation matériel, suivi	6	Marche
SGU-0853b	Bar-restaurant	Ind. ali	Niono	2a6	Pas financé	Etude extension devis, profoma		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SGU-0857	Embouche Industrielle	Prod ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
* SGU-0862	Transport	Ind embc	Ségou	3a1.2a2	4 885.035	Etude, évaluation camion, suivi	2	Marche
SGU-0866	Bar-Restaurant	Ind ali	Ségou	3a1.2a6	4 718 116	Etude, facture, installation, suivi	2	réhabilité, failite
SGU-0867	Pressing	Ind tex	Ségou	1a1, 1a2, 2a2	2 342 343	Etude, information, Factures, Suivi	3	Marche
SGU-0872	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A4,A5,A6	3 550 958	Etude, suivi	3	
SGU-0873	Bar-restaurant	Ind ali	Ségou	7, 3a1, 1a2, 1a4, 2a4	9 217 000	Etude, évaluation, installation, suivi	5	Marche
SGU-0879	Ferme agricole	Prod veg	Kondaga	3a1, 1a2, A6, 1a4	6 460 300	Etude, évaluation, facture, suivi	5	Marche
SGU-0898	Aleber de froid	Ind embc	Ségou	3a1	Pas financé	Etude, facture		
SGU-0900	Prestation agricole	Ind embc	Molodo	7, a3, 1a4	5 634 878	Etude, évaluation de réparation, suivi	2	arrêté
SGU-0903	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A4, A5, A6	4 873 387	Etude, suivi	3	
* SGU-0904	Tenturene	Ind tex	Ségou	3a1, 1a2, 2a2	1 744 000	Etude, évaluation, suivi	4	
SGU-0915	Cinéma ambulatant	Service	Ségou	3a1	Pas financé	Etude, factures, évaluation voiture		
* SGU-0916	Boulangerie	Ind ali	Ke-Macina	1a4, 2a4, 2a5, 1a6, 2a6	25 298 664	Etude, facture, réalisation, Suivi	8	Marche
SGU-0923	Decortage Riz	Ind ali	Niono N8	3a2, 1a4, 2a4, 1a6, 2a6	5 371 607	Etude, factures, suivi	4	Marche, réparation machine
SGU-0924	Transport-urban	Ind embc	Cinzana	1a6, 2a6	5 794 000	Suivi, installation	2	Demarrage, achat voiture
SGU-0926	Agro Pastoral	Prod ani	Ségou	3a1, 1a2	12 213 500	Etude, factures	0	
SGU-0926b	Bureautique	Ind embc	Bamako	1a4	Pas financé	Etude		
SGU-0927	Bananiere	Prod veg	Ségou	2a2	2 003 000	Etude	4	
SGU-0928	Embouche	Prod ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude		
SGU-0929	Manutenion de pieces	Ind embc	Ségou	3a1	Pas financé	Etude, promotion		
SGU-0936	Bijouterie	Ind embc	Ségou	3a1	Pas financé	Etude, factures		
SGU-0937	Decortage et commerce riz	Ind ali	Kourouma	3a2, 2a4	9 000 000	Etude, suivi	3	Marche
SGU-0938	Transport	Ind embc	Ségou	2a2, a3, 1a4	21 180 128	Suivi		
SGU-0940	Decortage	Ind ali	Kologo	a3	1 257 687	Suivi	2	Marche
SGU-0942	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A4, A5	3 848 547	Etude, suivi	3	
SGU-0944	Arts martiaux	Service	Ségou	3a1, 1a2	Pas financé	Etude, factures		
SGU-0947	Bar-Restaurant	Ind ali	Sirbala	3a1	Pas financé	Etude, factures		
SGU-0948	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A4, A5, A6	5 758 541	Etude, suivi	3	
* SGU-0950	Fabrication aliment volailles	Ind ali	Ségou	2a4, 1a5, 2a5, 1a6, 2a6	6 810 172	Etude, installation, suivi	5	Marche, réalisation d'un lamis
SGU-0956	Transport	Ind embc	Ségou	3a1	Pas financé	Etude, évaluation camion		
SGU-0958	Transport inter urban	Ind embc	Ségou	1a2, 2a2	Pas financé	Etude		
SGU-0961	Embouche industrielle	Prod ani	Ségou	A4, A5, A6	2 718 483	Etude, suivi	3	
SGU-0963	Commerce	Commerce	Ségou	1a4	2 465 278	Etude, suivi		Début d'exploitation
SGU-0971	Transport fret	Ind embc	Ségou	2a2, a3	Pas financé	Etude, évaluation camion		
SGU-0972	Bananiere	Prod veg	Ségou	2a2	Pas financé	Etude		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SGU-0974	Restaurant	Ind ali	Bla	2a2.3a2	3 900 000	Etude, apor personnel suivi	5	Marche
SGU-0976	Prestation agricole	Ind embc	Ségou	3a2.2a4.2a5.1a6.2a6	6 402 089	Etude, évaluation tracteur, suivi	2	Reparaton tracteur
SGU-0977	Transport de Carburant	Ind embc	Ségou	a3.1a4	Pas financé	Etude		
SGU-0984	Décorqueuse	Ind ali	Niono	1a4.2a4.1a5.1a6.2a6	7 028 000	Etude, installation, suivi	3	Projet en difficulté faillite
SGU-0985	Transport	Ind embc	Niono	2a4	Pas financé	Etude		
SGU-0988	Vente pièces ambulant	Ind embc	Cinzana	2a4	Pas financé	Etude		
SGU-0996	Rizere artisanale. Décorticage	Ind ali	Niono	1a4.2a4.1a5.1a6.2a6	5 900 000	Etude, installation, suivi	4	Failite, contentieux
SGU-1000	Buvette	Commerce	Ségou	2a5	875 000	Suivi	2	
SGU-1002	Transport	Ind embc	Ségou	2a2	Pas financé	Etude, évaluation camion		
SGU-1006	Garage	Ind embc	Fana	1a2. 2a2.3a2.1a4.2a5	2 100 000	Suivi	4	
SGU-1010	Pressing	Ind. tex	Ségou	2a2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-1011	Pieces detache cycles et cyclomoteur	Ind embc	Ségou	3a2	600 000	Etude, suivi	1	
SGU-1012	Station service	Ind embc	Kimparana	2a2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-1013	Décorticage et commerce cereales	Ind ali	Molodo	2a2.a3.2a4.1a6.2a6	5 163 566	Suivi	4	Suivi demarrage
SGU-1014	Production cuir de mangues	Ind ali	Ségou	2a2	Pas financé	Info, étude		
SGU-1015	Commerce sous produits agro	Commerce	Ségou	A4	Pas financé	Etude		
SGU-1017	Moulin	Ind ali	Diowara	2a2	Pas financé	Etude		
SGU-1018	Boulangere mmoderne	Ind ali	Bla	3a2.2a4	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-1019	Embouche industrielle	Prod an	Ségou	A4.A5.A6	37 460 000	Etude, suivi	14	Marche
SGU-1022	Prestation agricole (bateuse)	Ind embc	Ségou	2a2	Pas financé	Etude, factures		
SGU-1023	Pharmacie	Ens santé	Cinzana	1a4	3 522 388	Suivi	2	
SGU-1026	Buvette	Commerce	Markala	3a2	Pas financé	Etude		
SGU-1030	Bloc meure	Ind embc	Niono	1a6	Pas financé	Etude, information		
SGU-1031	Décorticage et commerce cereales	Ind ali	Diabali	3a2	Pas financé	Evaluation équipement		
SGU-1035	Pharmacie	Ens santé	Niono	2a6	2 231 075	Suivi	2	Marche
SGU-1046	Salon de couture	Ind. tex	Ségou	a3.1a6	1 792 875	Suivi	3	Marche
SGU-1052	Peinture bâtiments	Ind embc	Ségou-Bkc.	1a4.2a4	Pas financé	Etude		
SGU-1057	Transport fret	Ind embc	Ségou	1a4.2a4	Pas financé	Etude		
SGU-1061	Extraction sable	Ind embc	Markala	1a4.2a6	1 289 818	Suivi	3	Marche
SGU-1062	Ecole privée	Service	Ségou	1a4.1a6	9 036 132	Suivi		Suivi aménagement installation
SGU-1068	Dépot de boisson	Commerce	Ségou	2a4	Pas financé	Etude		
SGU-1086	Commerce de riz	Commerce	Ségou	2a4	7 638 901	Suivi		
SGU-1088	Ventes produits Cosmétiques	Commerce	Niono	1a4.2a4	3 512 560	Suivi		
SGU-1089	Confiserie	Ind ali	Ségou	1a5.2a5	Pas financé	Etude		
SGU-1090	Décorticage	Ind ali	Kolongo	2a4.2a5.1a6.2a6	5 464 197	Suivi	3	Installation terminée, marche

Projet DPU/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SGU-1091	Boulangerie	Ind. ali	Ségou	2a4	Pas financé	Etude		
SGU-1094	Décoricage	Ind. ali	Niono	2a4.1a5.1a6.2a6	15.940.721	Suivi	6	Investissement en cours marche
SGU-1095	Pharmacie	Ens. santé	Ségou	2a4.1a5	7.474.251	Suivi		Début investissement
SGU-1098	Couture moderne	Ind. tex	Ségou	2a4.2a5	3.660.828	Suivi	4	Investissement
SGU-1102	Embouche	Prod. ani	Ségou	2a4	1.265.065	Suivi	2	
SGU-1108	Ecole privée	Ens. santé	Ségou	1a5	Pas financé	Etude		
SGU-1110	Papeterie	Commerce	Niono	2a6	2.423.695	Suivi	2	Marche
SGU-1117	Dépôt pharmacie	Ens. santé	Banankoro	1a5	Pas financé	Etude		
SGU-1118	Détailant	Commerce	Ségou	1a5	Pas financé	Etude		
SGU-1121	Bar dancing	Service	Dioro	1a5	Pas financé	Etude		
SGU-1122	Tolere	Ind. embc	Niono	1a5	Pas financé	Etude		
SGU-1123	Riziculture	Prod. veg	Kokry	2a6	1.990.949	Suivi	4	Marche
SGU-1124	Hôtelerie	Service	Ségou	1a5	Pas financé	Etude		
SGU-1130	Auto cass	Ind. embc	Ségou-Bko	1a5.2a6	20.000.000	Etude.Suivi		
SGU-1131	Exploitation sable	Ind. embc	Ségou	1a5.2a5	Pas financé	Etude		
SGU-1139	Hôtelerie	Service	Ségou	1a5	Pas financé	Etude		
SGU-1140	Location chaises	Service	Ségou	1a5.2a5	2.638.035	Suivi		Amenagement installation
SGU-1141	Embouche-boucherie	Ind. ali	Ségou	1a6.2a6	Pas financé	Etude, démarrage sur fond propre		
SGU-1149	Alimentation	Commerce	Ségou	2a6	Pas financé	Etude, devis proforma		
SGU-1154	Cabinet topo	Service	Ségou	2a6	Pas financé	Etude, devis, Expertise bachee		
SGU-1155	Alimentation	Commerce	Ségou	1a6.2a6	5.351.883	Suivi	4	Démarrage
SGU-1156	Boulangerie	Ind. ali	Ségou	1a6.2a6	Pas financé	Etude, évaluation, proforma		
SGU-1157	Bar restaurant	Ind. ali	Ségou	2a6	Pas financé	Etude		
SGU-1162	Salon coiffure	Service	Ségou	2a6	Pas financé	Etude devis aménagement		
SGU-1163	Couture	Ind. tex	Ségou	2a6	Pas financé	Etude devis proforma		
SGU-1164	Décoricage commerce riz	Ind. ali	Molodo	2a6	Pas financé	Etude info et proforma		
SGU-1165	Dépôt de boisson	Commerce	Ségou	2a6	Pas financé	Etude évaluation devis proforma		
SGU-1166	Bar restaurant	Ind. ali	Ségou	2a6	Pas financé	Etude devis proforma		
SGU-1167	Pharmacie	Ens. santé	Ségou	2a6	Pas financé	Etude devis de construction		
SGU-1168	Salon coiffure	Service	Ségou	2a6	Pas financé	Etude extension, devis		
SGU-1173	Hotel	Service	Ségou	2a6	Pas financé	Etude, info, devis, proforma		
SGU-A	Commerce aliment bétail	Ind. ali	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-A	Embouche industrielle	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-A	Elevage porcin	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-A	Commerce bétail	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SGU-A	Commerce bétail	Prod. ani	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
SGU-A	Ferre	Prod. veg	Ségou	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
Projet ONUDI	Total des dossiers étudiés = 248		Total des investissements = 1.015.898.444			Total des emplois créés = 475		Projets réalisés =

Projets réalisés =	129
--------------------	-----

PROJET FED 1230 1.177.752.345 595 162

Rapport ONUDI/FED 0,20 0,86 0,80 0,80

Rapport : projets réalisés/dossiers ouvert:

ONUDI =	0,52
---------	------

FED =	0,13
-------	------

4.3 Antenne de Sikasso

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
Assistance au projet FED. antenne de Sikasso								
SKO-	Atelier Tissage	Ind. tex	Koutiala	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-	Cinéma	Service	Sikasso	1	Pas financé	Etude besoins énergie		Rien
SKO-	Reparation de batteries	Ind. embc	Sikasso	6.7	Pas financé	Etude, information		Rien
SKO-	Scierie	Ind. embc	Sikasso	1	Pas financé	Etude		Rien
SKO-	Vulcanisation	Ind. embc	Sikasso	6	Pas financé	Etude, information, factures		Rien
SKO-00	Soudage	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude,evaluation		
SKO-00	Emama	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude conseils factures		
SKO-00	Pressing	Ind. tex	Sikasso	a3	Pas financé	Etude		Rien
SKO-0002	Pharmacie	Ens. Santé	Sikasso	1a1	679.605	Suivi	2	Rien
SKO-0003	Teinturerie	Ind. tex	Sikasso	1a1	440.300	Suivi	2	Rien
SKO-0006	Boite de nuit Pléiades	Service	Sikasso	3a2.a3.1a4.2r 1a5	18.440.000	Suivi	14	Marché très bien
SKO-0014-6	Transport	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0016-6	Somame	Service	Sikasso	1a4.2a4.1a5.2a5	200.889.310	Etude,suivi	31	
SKO-0016-C	Rébobinage	Ind. embc	Koutiala	(2.3)a1.1a2	4.231.230	Suivi	4	Echoué
SKO-0017	Mini-Haïlerie	Ind. ali	Sikasso	a1.1a2.2a2.3a2.a3	28.865.000	Etude,factures, installation, suivi	5	Marché marginal
SKO-0018-6	Transport matériel construct'	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0020-3	C E CO M	Service	Sikasso	2a4.2a5.2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0021-3	Production de carreaux	Ind. embc	Sikasso	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0021-6	Transport	Ind. embc	Bougouni	2a4.2a6	9.946.336	Suivi	4	
SKO-0022-4	Boulangerie	Ind. ali	Sikasso	1a5.1a6	34.306.859	Suivi	11	
SKO-0022-6	Camion benne	Ind. embc	Koutiala	1a5.2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0023-3	Boulangerie de Kadiolo	Ind. ali	Kadiolo	1a6.2a6	36.989.417	Etude, Suivi	6	Marché
SKO-0023-6	Transport benne	Ind. embc	Kadiolo	2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0024-3	Imprimerie	Ind. embc	Sikasso	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0024-6	Transport en commun	Ind. embc	Sikasso	2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0025-6	Transport	Ind. embc	Sikasso	2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0026	Atelier forge-fonderie	Ind. embc	Koutiala	1a2	1.237.235	Suivi	4	Remboursé, marché
SKO-0026-C	Alimentation	Commerce	Bougouni	1a4.2a4.2a6	1.237.235	Suivi, refinancement	3	Marché bien
SKO-0027	Moulin Décortqueur	Ind. ali	Kadiolo	3a2.2a4.2a5.1a6.2a6	2.949.200	Etude, factures, achât, inst., suivi	2	Marché
SKO-0027-5	Atelier de soudure	Ind. embc	Koutiala	(2.3)a1.1a2	1.061.796	Suivi	4	Marché
SKO-0027-6	Transport	Ind. embc	Koutiala	1a5	Pas financé	Etude		
SKO-0028-6	Transport	Ind. embc	Koutiala	1a5	Pas financé	Etude		
SKO-0029	Moulin décortqueuse	Ind. ali	Kignan	2a2.3a2.a3.2a4	2.460.000	Suivi	2	Marché
SKO-0029-6	Transport en commun	Ind. embc	Sikasso	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0030	Clinique Privée	Ens. Santé	Sikasso	1a2. 2a2.1a4.2a4.1a5	12.903.000	Suivi	8	Problème de marché

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SKO-0031	Atelier forge, Soudure	Ind. embc	Sikasso	1a2	4.641.559	Suivi	10	Remboursé, marche
SKO-0033	Atelier de forge	Ind. embc	Koutiala	3a2	1.151.145	Suivi	6	Rien
SKO-0036	Magasin de Céréales	Ind. embc	Sikasso	3a1,a3	1.709.052	Suivi	2	Marche
SKO-0036-4	Atelier de forge	Ind. embc	Koumantou	3a2	Pas financé	Etude		
* SKO-0038	Moulin décortiqueur	Ind. ali	Koutiala	3a2,a3,1a4,2a4,1a6	2.462.000	Suivi	2	Marche bien
SKO-0038-4	Atelier de forge	Ind. embc	Koutiala	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0038-4	Operation puits	Ind. embc	Koutiala	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0040	Moulin Décortiqueur	Ind. ali	Klela	2a2,3a2,a3,2a4	2.397.000	Suivi	2	Remboursé marche
SKO-0042	Atelier de forge	Ind. embc	Sikasso	3a2	1.028.370	Etude, Installation		
SKO-0042-4	Atelier de tissage	Ind. tex	Koutiala	1a4,2a4,1a5,1a6,2a6	4.370.853	Suivi	8	
SKO-0044	Hôtel	Service	Sikasso	4, (2,3)a1,1a2, 2a2,a3	57.375.259	Etude, énergie, suivi	16	Marche bien
SKO-0045	Pharmacie	Ens. Santé	Sikasso	3a2, a3	6.716.000	Etude, Equipement	5	Marche bien
SKO-0045-4	Atelier de soudure	Ind. embc	Koutiala	1a5	Pas financé	Etude		
SKO-0049-C	Alimentation de la Gare	Commerce	Sikasso	2a2,3a2,a3,2a5	2.153.517	Suivi	1	Marche
SKO-0051-4	Atelier de forge	Ind. embc	Sikasso	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0052	Cinéma	Service	Kla	2a1	2.100.000	Suivi	6	Echoué
SKO-0052-4	Pharmacie traditionnelle	Ens. Santé	Bougouni	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0052-C	Magasin Prêt à porter	Ind. tex	Sikasso	3a1	Pas financé	Etude		
SKO-0053-4	Savonnerie moderne	Ind. embc	Bougouni	1a6,2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0053-C	Alimentation	Commerce	Bougouni	3a2	2.480.000	Etude, équipement	2	Marche bien
SKO-0054-C	Alimentation	Commerce	Sikasso	3a2,a3	1.421.000	Equipements	1	Marche
SKO-0055-4	Atelier de forge	Ind. embc	Garalo	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0057-4	Atelier de forge	Ind. embc	Sikasso	2a6	Pas financé	Etude		
* SKO-0060	Atelier tailleur	Ind. tex	Sikasso	2a1	2.341.000	Suivi	3	Marché
SKO-0062	Photocopie	Ind. embc	Sikasso	2a1	5.579.000	Suivi	2	Arrêt manque de pièces
SKO-0066-5	Alimentation	Commerce	Bougouni	3a2	4.809.000	Equipement	3	Marche
SKO-0068-5	Bouchère	Ind. ali	Koutiala	3a2,a3,1a4	Pas financé	Etude, factures		
SKO-0069-5	Produit frais	Commerce	Sikasso	3a2	1.779.000	Etude	2	Marche
SKO-0070-5	Station service	Ind. embc	Sikasso	2a4	Pas financé	Etude		
* SKO-0072-5	Peaux et cuire	Ind. embc	Koutiala	3a2	Pas financé	Etude		
* SKO-0074	Poissonnerie	Ind. ali	Sikasso	2a2,3a2,a3	2.840.000	Suivi	3	Echoué
SKO-0075-5	Fabrique de batonnet glacé	Ind. ali	Sikasso	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0076-5	Produit frais	Commerce	Sikasso	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0077	Moulin décortiqueur	Ind. ali	Sikasso	2a2,3a2,a3,1a4,2a4	3.069.000	Suivi	2	Echoué
SKO-0077-5	Produit frais	Commerce	Sikasso	3a2	558.000	Etude, suivi	1	Marche
SKO-0080-5	Alimentation	Commerce	Sikasso	3a2,1a4	Pas financé	Etude		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SKO-0086	Pharmacie vétérinaire	Ens. Santé	Bougouni	1a4	5.557.290	Suivi, inspection travaux	3	Marche bien
SKO-0089	Vente de produit frais	Commerce	Koufiala	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0092	Campement	Service	Koufiala	2a1	Pas financé	Etude		
SKO-0092-5	Dépôt de boisson	Commerce	Sikasso	a3,2a4,1a5	4.810.600	Suivi	4	Marche bien
SKO-0093-5	Alimentation	Commerce	Sikasso	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0095-5	Produit frais syama	Commerce	Sikasso	1a4,2a4,1a5,2a5,2a6	13.061.153	Suivi	15	Marche très bien
SKO-0097-5	Prêt à porter	Ind. tex	Koufiala	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0101-5	Quincaillerie	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0105	Station Service	Ind. embc	Kadiolo	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0106	Mini-market	Commerce	Sikasso	2a1	2.175.139	Suivi	2	Echoué
SKO-0112	Restaurant moderne	Ind. ali	Kla	2a1, a3	7.117.250	Réception, suivi, réinstall	5	Echoué
SKO-0114	Atelier de Forge Niena	Ind. embc	Nièna	1a4,2a4,1a5,2a5,2a6	32.471.618	Etude, lay-out, installation, suivi, réfinanc	16	Marche bien, réfinancé
SKO-0116	Produits laitiers	Ind. ali	Koufiala	2a1	556.000	Suivi	2	Echoué
SKO-0117	Magasin d'alimentation	Commerce	Sikasso	2a1, a3, 2a6	2.729.000	Etude, achat, installation, suivi	1	Marche bien
SKO-0123	Buvette	Service	Sikasso	2a1, 1a2, 2a2, 3a2, a3	1.418.000	Etude, achat, suivi	2	Marche
SKO-0125	Moulin	Ind. ali	Sikasso	2a1	1.087.000	Etude	2	Arrêt manque de pièces
SKO-0126	Vidéo club	Service	Kla	1a2, 3a2, a3, 1a6, 2a6	2.474.000	Etude, achat, Suivi	2	Marche bien
SKO-0138	Hôtel zégoua	Service	Zegoua	1a4, 2a4, 1a5, 2a5, 1a6	1.625.000	Equipement Suivi	4	Marche
SKO-0140	Salon de coiffure	Service	Sikasso	1a2, 2a2, 3a2	1.980.000	Suivi	3	Marche
SKO-0142	Studio-photo	Ind. embc	Sikasso	2a2	1.384.000	Suivi	2	Marche très bien
SKO-0143	Extraction des mœitons	Ind. embc	Sikasso	3a2	1.384.000	Suivi	6	Echoué
SKO-0145	Aviculture	Prod. ani	Sikasso	3a1	3.565.250	Suivi	2	Marche, remboursé, réfinancé
SKO-0146	Maraichage	Prod. veg	Kéléya	2a1, 2a2, 1a4, 2a6	11.388.000	Suivi	7	Marche
SKO-0147	Maraichage	Prod. veg	Sikasso	2a1	4.791.000	Reception, Suivi	2	Remboursé
SKO-0148-2	Radianc	Service	Sikasso	3a2	506.000	Etude, Suivi	3	Problème de marché
SKO-0149	Photo-labo	Ind. embc	Sikasso	2a2	Pas financé	Info, étude		
SKO-0150-2	Bar Restaurant	Ind. ali	Sikasso	3a2	1.375.000	Etude, équipement, suivi	3	Faillite
SKO-0153-2	Photo-labo	Ind. embc	Sikasso	3a2	Pas financé	Etude, factures		
SKO-0154-2	Baleuse	Ind. embc	Kébila	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0155-2	Bar restaurant	Ind. ali	Sikasso	3a2	2.291.000	Etude, équipement Suivi	3	Marche très bien
SKO-0162-2	Service d'entretien	Ind. embc	Sikasso	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0164-2	Atelier de couture	Ind. tex	Sikasso	3a2	Pas financé	Etude		
SKO-0166-2	Atelier de froid	Ind. embc	Sikasso	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0172-5	Alimentation Buvette	Commerce	Sikasso	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0173-2	Bar-Restaurant	Ind. ali	Farako	3a2, 1a4, 2a4	4.612.370	Etude achat installation	8	
SKO-0173-5	Vente de pièces d'occasion	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude factures		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SKO-0174-2	Studio Photo	Ind. embc	Sikasso	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0175-2	Atelier moderne (diesel)	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0175-5	Pièces détachés motos	Ind. embc	Koutiala	a3,1a4	1.759.023	Suivi	1	Marche
SKO-0176-2	Pressing	Ind. tex	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0181-2	Renovation cinéma liberté	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0182-2	Atelier froid	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0182-5	Fabrique de meubles en nylon	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0183	Fabrique de glace	Ind. ali	Selingué	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0183-2	Moulin décortiqueur	Ind. ali	Zianso	2a4,1a5,2a5,1a6,2a6	4.810.600	Suivi	3	
SKO-0183-5	Quincaille	Ind. embc	Bougouni	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0184-2	Vidéo ambulant	Service	Koutiala	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0184-2	Vidéo-ambulant	Service	Koutiala	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0184-2	Vidéo-ambulant	Service	Koutiala	1a4	3.232.326	Suivi	3	
SKO-0184-5	Projet Exploitation forestière	Prod. veg	Bougouni	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0185-2	Vidéo Abba	Service	Sikasso	1a4,2a4	3.269.029	Suivi	3	
SKO-0187-2	Renovation Atelier de broderie	Ind. tex	Bougouni	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0187-2	Atelier broderie	Ind. tex	Bougouni	1a4,2a4,2a6	2.090.830	Suivi	4	
SKO-0191-2	Photo-labo	Ind. embc	Koutiala	1a4,2a4,1a5,2a5,1a6	37.124.060	Suivi	9	
SKO-0191-2	Labo-Photo	Ind. embc	Koutiala	1a4,2a5,2a6	37.124.060	Suivi	9	
SKO-0192-2	Entreprise de construction	Ind. embc	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0193-5	Vente de pièces détachées	Ind. embc	Bougouni	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0194-2	Atelier de broderie	Ind. tex	Sikasso	2a4,1a5	4.030.555	Suivi	3	
SKO-0195-2	Atelier de couture	Ind. tex	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0196-2	Vidéo-club	Service	Sikasso	1a4,2a4	4.096.273	Suivi	3	
SKO-0197-2	Camion spiros	Ind. embc	Koutiala	1a4,2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0200-2	Atelier de couture et broderie	Ind. tex	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0201-5	Crème et glace	Ind. ali	Sikasso	2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0202	Transport	Ind. embc	Bougouni	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0202-2	Ebeniste	Ind. embc	Koutiala	2a4,1a6	1.506.445	Suivi	3	
SKO-0202-6	Transport marchandises	Ind. embc	Bougouni	2a4,2a6	7.949.200	Suivi	5	
SKO-0203-2	Moulin décortiqueur	Ind. ali	Loufouni	2a4,1a5,2a5,1a6,2a6	1.938.271	Suivi	3	
SKO-0203-5	Alimentation	Commerce	Sikasso	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0204-2	Atelier de menuiserie	Ind. embc	Sikasso	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0205-2	Atelier broderie	Ind. tex	Sikasso	2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0208-2	Atelier de Charge batterie	Ind. embc	Sikasso	2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0210-2	Hôtel balazan	Service	Bougouni	2a4,1a6,2a6	19.558.489	Suivi	8	

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
SKO-0213-2	Buvette ABATA	Service	Sikasso	1a5	Pas financé	Etude		
SKO-0215-2	Kéné-labour	Ind. embc	Sikasso	2a4,2a5	Pas financé	Etude		
SKO-0217-2	Extension-restaurant Débagnouma	Ind. ali	Bougouni	2a4,1a5,1a6,2a6	2.367.334	Suivi	5	
SKO-0219-2	Vidéo-Club	Service	Koutala	1a5	Pas financé	Etude		
SKO-0223-2	Cinema Folona	Service	Zegoua	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0226-2	Garage mecanique	Ind. embc	Sikasso	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0227-2	Vulcanisation	Service	Koutala	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0230	Jeux de société	Service	Sikasso	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0234	Maraichage	Prod. veg	Korou	3a1	Pas financé	Etude		Irrigation avec pompe solaire
SKO-0301-5	Kiosque et bandes dessinées	Service	Sikasso	1a4,2a4	548.795	Suivi	1	
SKO-0308-5	Dépôt boisson	Commerce	Bougouni	2a4	Pas financé	Etude		
SKO-0311-2	Dépôt de boisson	Commerce	Koutala	1a5	Pas financé	Etude		
SKO-0312	Kene-potager	Prod. veg	Sikasso	3a2,a3,2a4	3.771.573	Etude, pompe, Suivi	5	Marche
SKO-0313-5	Boucherie moderne	Ind. ali	Sikasso	1a5,2a5	Pas financé	Etude		
SKO-0315-5	Dépôt de pharmacie	Ens. Santé	Bougouni	2a6	2.084.828	Suivi	3	
SKO-0321-5	Station d'essence	Ind. embc	Selingue	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0327-5	Alimentation mutuelle	Commerce	Bougouni	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0329-5	Vente de colorants	Commerce	Sikasso	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0333	Maraichage	Prod. veg	Bougouni	a3,1a4,2a4,2a6	6.628.674	Etude equipement Suivi	4	Attend la pompe
SKO-0335-5	Alimentation	Commerce	Bougouni	1a6	Pas financé	Etude		
SKO-0339-5	Quincaillerie	Ind. embc	Sikasso	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0345-5	Alimentation	Commerce	Bougouni	2a6	Pas financé	Etude		
SKO-0348-1	Construction barrage maraichage	Prod. veg	N'Golocoun	a3	Pas financé	Etude		
SKO-0360	Exploitation tracteur	Ind. embc	Kouniana	1a4	Pas financé	Etude		
SKO-0375-1	Exploitation tracteur	Ind. embc		1a5	Pas financé	Etude		
SKO-0378-1	Exploitat* d'une decortiqueuse rizicult	Ind. ali	Klela	2a5	Pas financé	Etude		
Projet ONUDI		Total des dossiers étudiés = 172		Total des investissements = 719.846.299		Total des emplois créés = 351		Projets réalisés = 79

PROJET FED

957

788.248.855

488

141

Rapport ONUDI/FED

0,18

0,91

0,70

0,56

Rapport : projets réalisés/dossiers ouvert:

ONUDI = 0,48

FED = 0,15

4.4 Antenne de Mopti

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
Assistance au projet FED. antenne de Mopti								
MTI-	Cabinet d'études Topo et Genie Civil	Service	Sevaré	2a6	Pas financé	Etude		
MTI-	Maraichage	Prod. veg	Mopti	a3	Pas financé	Etude		
MTI-	Mercerie	Service	Mopti	2a6	Pas financé	Etude.info.proforma		
MTI-	Pièces détachées	Ind. embc	Mopti	a3	Pas financé	Etude		
MTI-	Vidéo ambulant	Service	Sevaré	1a4	Pas financé	Etude		
MTI-0003	Atelier de forge	Ind. embc	Mopti	2a1	Pas financé	Etude. factures		
* MTI-0012	Transport fluvial	Ind. embc	Mopti	1a1	Pas financé	Etude. demande info et factures		
* MTI-0015	Commerce betail	Prod. ani	Mopti	A2,A3	Pas financé	Etude. évaluation promoteur		
MTI-0016	Fabrication pirogues	Ind. embc	Mopti	1a1	Pas financé	Etude. conseils		
MTI-0017	Campement Hombon	Service	Hombori	3a2,a3	7.764.359	Etude. equipements. financé	5	Marche
MTI-0018	Fonderie marmites alum	Ind. embc	Mopti	1a1	291.078	Suivi	4	
MTI-0021	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A2,A3,A4,A5	8.773.000	Etude. suivi	5	Marche
MTI-0022	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A2,A3,A5	10.629.434	Etude. suivi	4	Marche
* MTI-0022b	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A4	Re-financement	Etude		
MTI-0023	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A4,A5,A6	10.629.000	Etude. suivi	6	
MTI-0024	Tissage	Ind. tex	Mopti	1a4	625.487	Suivi	4	
MTI-0027	Armurier	Ind. embc	Sevaré	3a1,1a2	Pas financé	Etude. factures		
MTI-0035	Boulangerie	Ind. ali	Koro	1a2, 2a2	Pas financé	Etude. factures		
MTI-0038	Aviculture	Prod. ani	Mopti	A3,A4, A5	3.927.532	Suivi	9	Marche
MTI-0039	Photo-labo	Ind. embc	Mopti	2a2	Pas financé	Etude factures		
MTI-0042	Menuiserie metalique	Ind. embc	Mopti	1a6	Pas financé	Etude		
MTI-0042	Fabrication grillage	Ind. embc	Mopti	2a2,3a2	Pas financé	Etude. factures		
MTI-0043	Couture brodés	Ind. tex	Mopti	3a1, 1a2, 1a4	16.657.915	Suivi	10	
MTI-0044	Décorqueuse de riz	Ind. ali	Barbé	1a4,2a4,1a5,1a6 2a6	8.639.062	Suivi	3	
MTI-0045	Bouche	Ind. ali	Mopti	A4, A5	Pas financé	Etude		
* MTI-0046	Bar-Restaurant	Ind. ali	Barbé	3a2,a3,1a4,1a5,2a5	4.992.000	Etude. suivi	3	Marche
MTI-0047	Embouche industrielle	Prod. ani	Mopti	A4, A5	8.707.221	Suivi	2	
MTI-0055	Aviculture	Prod. ani	Mopti	A4, A5	Pas financé	Etude		
MTI-0058	Aliment bétail broyeur	Ind. ali	Sevaré	1a2, 2a2,1a4,2a4	2.430.000	Etude. recherche materiel.Suivi	4	Echoué
MTI-0059	Maraichage	Prod. veg	Mopti	a3,1a4,2a4,1a5,2a6	686.000	Suivi	3	
MTI-0064	Service agricole	Ind. embc	Tenenkou	a3,2a4, 2a5	17.655.000	Etude.choix equipment Suivi	3	Marche
MTI-0066	Maraichage	Prod. veg	Kami	a3,1a4,2a4,1a5,2a6	3.649.182	Suivi	3	Marche
MTI-0068	Restaurant	Ind. ali	Mopti	2a4	5.000.781	Suivi	11	
* MTI-0074	Embouche	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude. évaluation promoteur		
MTI-0080	Fabrication de pirogues	Ind. embc	Mopti	3a2	Pas financé	Etude		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
MTI-0085	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A3	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0089	Brodérie	Ind. tex	Mopti	1a4	6.485.358	Suivi	8	
* MTI-0090	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A4, A5	7.478.487	Suivi	3	
* MTI-0101	Embouche ovine	Prod. ani	Mopti	A4, A5	Pas financé	Etude		
* MTI-0107	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A3	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
* MTI-0109	Pêche	Prod. ani	Mopti	A4, A5	Pas financé	Etude		
MTI-0111	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A3	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0112	Pressing	Ind. tex	Mopti	2a2	Pas financé	Etude		
MTI-0113	Bateau Mali	Ind. embc	Mopti	2a2	Pas financé	Etude		
MTI-0114	Station hydro-carbure	Ind. embc	Niantunké	2a2	33.795.019	Etude Evaluation	8	Marche
MTI-0115	Campement Hogon	Service	Bankass	a3.1a4.2a4	1.558.079	Etude, financé Suivi	3	Marche
MTI-0139	Embouche Industrielle	Prod. ani	Korientzé	A4, A5	5.349.000	Etude, évaluation promoteur, Suivi	2	
MTI-0141	Commerce de boeufs	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0145	Commerce de poisson	Prod. ani	Mopti	A6	Pas financé	Etude		
MTI-0146	Transport inter urbain	Ind. embc	Mopti	2a2.3a2.2a4.1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0147	Transport inter urbain	Ind. embc	Mopti	2a2	Pas financé	Etude, évaluation voiture		
MTI-0148	Vente Pieces detachee	Ind. embc	Mopti	2a2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0149	Decortiqueuse	Ind. ali	Mopti	3a2.1a4	6.243.971	Suivi	4	Marche
MTI-0150	Pâtisserie	Ind. ali	Mopti	2a2	Pas financé	Etude, besoin d'énergie		
MTI-0151	Embouche ovine	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0159	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A4, A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0159b	Commerce de boeufs	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0160	Embouche industrielle	Prod. ani	Mopti	A6	7.707.832	Suivi	2	
MTI-0162	Embouche	Prod. ani	Mopti	A5	8.387.510	Suivi	3	
MTI-0167	Embouche ovine	Prod. ani	Mopti	A5	2.108.517	Suivi	3	
MTI-0169	Commerce de boeufs	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0171	Embouche	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0180	Vente de pièces détachées	Ind. embc	Mopti	2a2	7.095.928	Suivi	2	Marche
MTI-0181	Embouche ovine	Prod. ani	Mopti	A4	Pas financé	Etude		
MTI-0183	Station hydro-carbure	Ind. embc	Koro	3a2.1a5.2a6	27.529.345	Etude factures, Suivi	6	
MTI-0187	Commerce de boeufs	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0190	Embouche	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0192	Commerce d'ovins	Prod. ani	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0193	Marachage	Prod. veg	Mopti	A5	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0202	Décorticage et commerce de riz	Ind. ali	Sevaré	3a2.1a4.2a4.1a5.1a6	6.203.238	Suivi	4	
MTI-0204	Commerce de poisson	Prod. ani	Mopti	A6	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
MTI-0208	Transport mat. construction	Ind. embc	Sevaré	3a2.1a4	Pas financé	Etude factures		
MTI-0212	Salle de Cinéma	Service	Mopti	a3	7.626.272	Suivi	11	
MTI-0215	Station Essence	Ind. embc	Douentza	a3	Pas financé	Etude		
MTI-0217	Vente pièces détachées	Ind. embc	Mopti	3a2	1.149.505	Suivi	3	
MTI-0218	Embouche industrielle	Prod ani	Mopti	A6	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0221	Commerce de céréales	Commerce	Mopti	A6	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-0225	Transport urbain	Ind. embc	Mopti	a3	Pas financé	Etude		
MTI-0238	Décoriqueuse commercialisal* riz	Ind. ali	Kona	a3.2a4.1a5	9.505.811	Suivi	8	Marche
MTI-0241	Campement	Service	Bandiagar	1a4	Pas financé	Etude		
MTI-0245	Dépôt de boissons	Ind. ali	Bandiagar	2a6	3.979.474	Suivi	2	
MTI-0264	Cinema ambulani	Service	Sevaré	1a5	4.786.206	Suivi	3	
MTI-0265	Transport de marchandises	Ind. embc	Mopti	2a4.1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0266	Transport inter-urbain	Ind. embc	Mopti	2a4.1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0268	Pharmacie Humaine	Ens. Santé	Sevaré	2a6	Pas financé	Etude		
MTI-0270	Tannerie	Ind. embc	Sevaré	2a4.1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0274	Transport urbain	Ind. embc	Mopti	2a4.1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0275	Menuiserie métallique	Ind. embc	Sevaré	2a4	Pas financé	Etude		
MTI-0276	Vente audio visuels	Commerce	Mopti	2a4	2.383.700	Suivi	2	
MTI-0277	Cinema ambulani	Service	Sevaré	1a5.1a6	4.124.143	Suivi	2	
MTI-0278	Savonnerie	Ind. embc	Sevaré	1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0279	Transport urbain	Ind. embc	Mopti	1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0280	Exploitation décoriqueuse	Ind. ali	Mopti	1a5	3.026.985	Suivi	6	
MTI-0281	Décoriqueuse	Ind. ali	Mopti	1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0283	Parc taxi ville	Ind. embc	Mopti	2a5	Pas financé	Etude		
MTI-0284	Exploitation tracteur	Ind. embc	Mopti	1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0285	Rest-dancing	Service	Mopti	1a5	Pas financé	Etude		
MTI-0286	Restaurant Hôtel	Ind. ali	Tene	1a5.2a5.1a6	5.412.230	Suivi	7	
MTI-0293	Vente de poissons	Ind. ali	Mopti	1a6	2.922.487	Suivi	1	
MTI-0294	Moulin aliment betail	Ind. ali	Sevaré	2a5	Pas financé	Etude		
MTI-0297	Boulangerie moderne	Ind. ali	Mopti	2a6	Pas financé	Etude		
MTI-0302	Vente de ciment	Ind. embc	Mopti	1a6	Pas financé	Etude		
MTI-0304	Salon de couture	Ind. tex	Mopti	1a6	3.382.749	Suivi	5	
MTI-0306	Bar restaurant dancing	Ind. ali	Mopti	1a6	24.870.685	Suivi	6	
MTI-0307	Parc taxi ville	Ind. embc	Mopti	2a6	Pas financé	Etude		
MTI-0308	Transport	Ind. embc	Mopti	1a6	Pas financé	Etude		
MTI-0311	Maraichage	Prod. veg	Tibo	1a6	Pas financé	Etude		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
MTI-0313	Distributions de lubrifiants	Ind embc	Mopti	1a6	Pas financé	Etude		
MTI-0314	Vente de pneu rechapés	Ind embc	Mopti	1a6	Pas financé	Etude		
MTI-0316	Unité de balleuses	Ind embc	Mopti	1a6.2a6	Pas financé	Etude		
MTI-0317	Riziculture	Prod. veg	Dakakono	1a6	Pas financé	Etude		
MTI-0318	Depannage/vente pièce audio visuel	Service	Sévaré	2a6	Pas financé	Etude		
MTI-0325	Restaurant Bar-dancing	Ind ali	Sévaré	2a6	Pas financé	Etude		
MTI-0342	Vente articles de menuiserie	Ind embc	Mopti	2a6	Pas financé	Etude		
MTI-0759	Autocar	Ind embc	Mopti	a3	Pas financé	Etude		
MTI-0970	Garage moderne	Ind embc	Sévaré	2a4.1a5	Pas financé	Etude		
MTI-A	Bouchene	Ind ali	Mopti	A3	Pas financé	Etude		
MTI-A	Prestation agricole	Ind embc	Mopti	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-A	Aviculture	Prod ani	Mopti	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-A	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-A	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
MTI-A	Embouche Industrielle	Prod. ani	Mopti	A2	Pas financé	Etude, évaluation promoteur		
Projet ONUDI		Total des dossiers étudiés = 122		Total des investissements = 304.029.590		Total des emplois créés = 181		Projets réalisés = 40

PROJET FED

340

398.635.040

292

73

Rapport ONUDI/FED

0,36

0,76

0,69

0,55

Rapport : projets réalisés/dossiers ouvert:

ONUDI = 0,33

FED = 0,21

4.5 Antenne de Kayes

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
Assistance au projet FED. antenne de Kayes								
KYS-0001	Aviculture	Prod. ani	Kayes	1a4.2a4.1a6	3.757.517	Etude,suivi	2	Pas en pleine activité.marche
KYS-0004	Transport	Ind. embc	Kayes	1a4	Pas financé	Etude		
KYS-0007	Maraichage	Prod. veg	Kayes	a3.1a4.2a4.1a6.2a6	3.455.437	Etude,suivi	5	Amenagement.marche
KYS-0009	Fabrique de glaces	Ind. ali	Kayes	1a6	Pas financé	Etude		
KYS-0011	Alimentation	Commerce	Kayes	a3	Pas financé	Etude		
KYS-0012	Boucherie moderne	Ind. ali	Kayes	a3.1a4.2a4.1a5	5.621.357	Etude,suivi	5	Marche
KYS-0015	Entreprise de machine agricole	Ind. embc	Diéma	a3	Pas financé	Etude		
KYS-0018	Commerce de céréales	Service	Kita	1a4	Pas financé	Etude		
KYS-0022	Location cassette Vidéo. repiquage	Ind. embc	Keniéba	a3.1a4.2a4.1a6.2a6	3.673.563	Etude,suivi	2	Marche
KYS-0023	Labo-photo	Ind. embc	Kayes	2a4.1a5.2a5.1a6.2a6	13.957.014	Etude,suivi	1	Amenagemt attente équipement
KYS-0027	Location Chaises et Amplificateur	Ind. embc	Kayes	a3.1a4	1.426.520	Etude,suivi	3	Marche
KYS-0029	Dépôts de boissons	Commerce	Kayes	a3.1a4.2a4	7.226.973	Etude,suivi	3	Marche
KYS-0032	Bar restaurant motel	Ind. ali	Kayes	2a4.1a5.2a5.1a6.2a6	6.408.013	Etude,suivi	5	Marche
KYS-0033	Alimentation	Commerce	Kayes	1a4	2.507.776	Etude,suivi	2	Marche
KYS-0034	Embouche bovine	Prod. ani	Kayes	1a4.2a4	6.381.630	Etude,suivi	3	Marche
KYS-0035	Vulcanisation	Ind. embc	Kayes	1a4.2a5.1a6	2.586.934	Etude,suivi	2	Marche
KYS-0038	Boulangerie moderne	Ind. ali	Kayes	2a4.1a5.2a5.1a6.2a6	34.327.625	Etude,suivi	12	Marche
KYS-0039	Tenture moderne	Ind. tex	Kayes	1a4	852.490	Etude,suivi	2	Marche
KYS-0040	Boulangerie industrielle	Ind. ali	Diéma	a3	Pas financé	Etude		
KYS-0041	Entreprise de menuiserie industrielle	Ind. embc	Diéma	a3.1a4.2a4	Pas financé	Etude		
KYS-0042	Entreprise adduction d'eau plomberie	Ind. embc	Diéma	a3.1a4.2a4	Pas financé	Etude		
KYS-0043	Entreprise mécanique auto pl 4x4	Ind. embc	Diéma	a3.1a4.2a4	Pas financé	Etude		
KYS-0044	Entreprise industrielle d'électricité	Ind. embc	Diéma	a3.1a4.2a4	Pas financé	Etude		
KYS-0045	Atelier de forge	Ind. embc	Diéma	1a4.2a4.2a6	7.292.216	Etude,suivi	6	
KYS-0046	Boulangerie industrielle	Ind. ali	Diéma	2a4.1a5.2a5.1a6.2a6	23.955.280	Etude,suivi	6	Amenagement
KYS-0047	Atelier de forge	Ind. embc	Diéma	2a4.1a6.2a6	7.292.216	Etude,suivi	2	Construction
KYS-0048	Atelier de couture	Ind. tex	Kayes	1a4.2a5	4.675.733	Etude,suivi	1	Marche
KYS-0052	Embouche bovine	Prod. ani	Kayes	1a4.2a4	6.377.180	Etude,suivi	3	Marche
KYS-0053	Service Bureauque	Service	Kayes	1a4.2a4.1a5.2a5.1a6	4.099.797	Etude,suivi	3	Amenagement
KYS-0055	Magasin vente pièces détachées	Ind. embc	Kayes	2a5	Pas financé	Etude		
KYS-0057	Entreprise d'électricité bâtiment froid	Ind. embc	Kayes	1a4	Pas financé	Etude		
KYS-0058	Transport benne	Ind. embc	Kayes	1a4.2a4.2a5	5.693.081	Etude,suivi	3	Marche
KYS-0064	Roïsserie	Ind. ali	Kayes	1a4.2a4.1a5.2a5	2.437.540	Etude,suivi	2	Marche
KYS-0068	Vulcanisation	Ind. embc	Kayes	2a4.1a5	2.566.934	Etude,suivi	1	Amenagement
KYS-0069	Dépôt de pharmacie	Ens. Santé	Toukoto	1a4	Pas financé	Etude		

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 31/12/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque	
KYS-0073	Pate d'arachide	Ind. ali	Kita	1a8,2a6	Pas financé	Etude			
KYS-0077	Auto Casse	Ind. embc	Kayes	1a5,1a6,2a6	2.537.938	Etude,suivi	1	Amenagement	
KYS-0086	Motel de Kayes	Service	Kayes	2a4,1a5	Pas financé	Etude			
KYS-0088	Spiros	Ind. embc	Kayes	1a5	Pas financé	Etude			
KYS-0089	Librairie papeterie	Service	Keniéba	2a4,1a5,1a6,2a6	2.528.558	Etude,suivi	2	Marche	
KYS-0094	Pâtisserie	Ind. ali	Kayes	1a6	Pas financé	Etude			
KYS-0101	Clinique	Ens. Santé	Kayes	2a4,1a5,1a6,2a6	42.118.219	Etude,suivi	18	Marche en attente d'équipemts	
KYS-0102	Atelier de couture	Ind. tex	Kayes	1a5,1a6,2a6	4.684.723	Etude,suivi	3	Amenagement	
KYS-0103	Maraichage	Prod. veg	Mahina	1a5	Pas financé	Etude			
KYS-0106	Dépôt de Pharmacie	Ens. Santé	Keniéba	1a6,2a6	4.291.178	Etude,Suivi	2	Marche	
KYS-0123	Boulangerie keniéba	Ind. ali	Keniéba	1a6,2a6	31.085.951	Suivi	10	Commande équipements	
KYS-0124	Jardin d'enfants	Ens. Santé	Kayes	1a8,2a6	4.312.965	Etude,suivi	2	Amenagement	
KYS-0153	Imprimerie	Ind. embc	Kayes	2a6	Pas financé	Etude			
KYS-0154	Officine de pharmacie	Ens. Santé	Nioro	2a6	Pas financé	Etude			
KYS-0242	Cinéma ambulant	Service	Keniéba	a3	Pas financé	Etude			
KYS-0717	Maraichage	Prod. veg	Kayes	a3,1a4,2a4,1a5,2a5	3.553.266	Etude,suivi	2	Marche	
Projet ONUDI		Total des dossiers étudiés=	51	Total des investissements =	251.854.624	Total des emplois créés =	114	Projets réalisés =	30

PROJET FED

92

258.555.325

118

33

Rapport ONUDI/FED

0,55

0,97

0,97

0,91

Rapport : projets réalisé/dossiers ouvert:

ONUDI = 0,59

FED = 0,36

4.6 Antenne de Tombouctou

Projet DPL/MLI/85/011/ XA/MLI/90/625 total au 30/09/92

N°Projet	Nom	Activité	Lieux	Rapports	Invest.	Intervention	Emplois	Remarque
TBU-0006	Riziculture	Agro	Tombouctou	a3	10.232.493	Etude		
TBU-0007	Riziculture	Agro	Tombouctou	a3	Pas financé	Etude		
TBU-0007	Décoriqueuse	Service	Tombouctou	2a4	Pas financé	Etude		
TBU-0021	Atelier de fondérie	Service	Tombouctou	2a4	1.329.633	Suivi	5	
TBU-0051	Riziculture & maraichage	Agro	Tombouctou	2a4	2.722.065	Suivi	5	
TBU-0089	Atelier métallique	Service	Niafunké	2a4	Pas financé	Etude		
TBU-0116	Moulin decortiqueur	Service	Tounka	2a4	Pas financé	Etude		
TBU-0129	Décoriqueuse	Service	Tombouctou	2a4	Pas financé	Etude		
Projet ONUDI	Total des dossiers étudiés = 8		Total des investissements = 14.284.191			Total des emplois créés = 10		Projets réalisés = 8

PROJET FED

210

223.789.652

164

43

Rapport ONUDI/FED

0,04

0,06

0,06

0,07

Rapport : projets réalisé/dossiers ouvert:

ONUDI = 0,38

FED = 0,20

A N N E X E 5

**Nombre d'interventions et de nouveaux dossiers
créés par la cellule d'appui logistique du siège**

APPUI LOGISTIQUE SIEGE.

PERIODE	Nombre INTERVENTIONS	Cumul Nbre INTERVENTIONS	Nombre Nvx DOSSIERS	Cumul Nbre DOSSIERS
15.02.88	-	-	-	-
16.02-15.05.88	2	2	2	2
16.05-15.08.88	4	6	3	5
16.08-15.11.88	6	10	4	9
16.11-15.02.89	9	19	5	14
16.02-15.05.89	7	26	5	19
16.05-15.08.89	6	32	4	23
16.08-15.11.89	7	39	4	27
16.11-15.02.90	17	56	8	35
16.02-31.03.90	14	68	6	41
01.04-31.05.90	12	80	6	47
01.06-15.08.90	9	89	4	51
16.08-15.11.90	10	99	6	57
16.11-15.02.91	10	109	5	62
16.02-31.05.91	14	123	8	70
01.06-31.10.91	9	132	6	76
01.11-29.02.92	8	140	5	81
01.03-30.04.92	6	146	5	86
01.05-30.06.92	13	159	8	90
18.08-17.10.92	6	165	4	94
18.10-31.12.92	7	172	5	99
